

Rendición

# CUENTAS

2024



**PREFECTURA DE  
BOLÍVAR**

Un nuevo tiempo  
*Hombre a hombre*



HOMBRE A HOMBRE

**ANÍBAL CORONEL**  
PREFECTO DE BOLÍVAR

# RENDICIÓN DE CUENTAS

## EJERCICIO FISCAL 2024

*Estimada/os Bolivarenses:*

Como Prefecto de la Provincia de Bolívar, me complace presentar el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024 del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar, en cumplimiento a lo dispuesto en la **Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, y demás normativas vinculantes que garantizan el derecho ciudadano a ser informados sobre el uso de los recursos públicos por parte de las instituciones y autoridades de elección popular.

La **Rendición de Cuentas** no es solo un mandato legal; para mí, es un principio de vida y creo firmemente en una gestión democrática, transparente y participativa. Por ello, agradezco profundamente el respaldo de la **Asamblea Local de Participación Ciudadana**, que ha cumplido su rol de fiscalización y ha acompañado activamente los procesos de planificación y control ciudadano, herramientas claves para garantizar una planificación operativa eficiente y alineada con las verdaderas necesidades de nuestra gente.

Ha transcurrido ya el segundo año desde que asumí con honor esta responsabilidad, y desde el primer día de gestión he trabajado con decisión y compromiso por cumplir las metas y objetivos establecidos en mi **Plan de Trabajo** vinculadas a las necesidades de la Provincia. El camino no ha sido fácil; hemos enfrentado múltiples obstáculos, específicamente Financieras por limitaciones en las asignaciones económicas debido al modelo de equidad.

A estos desafíos se sumaron fenómenos naturales como las fuertes lluvias e inundaciones que obligaron a declarar la emergencia en la provincia de Bolívar, los cuales lo hemos enfrentando con recursos propios, reorganizando las finanzas y postergando algunos proyectos previstos en el presupuesto 2024, pues priorizamos la atención de las zonas más afectadas.

Este informe detalla el cumplimiento de la ejecución presupuestaria en cada una de las áreas operativas de la institución, el avance del Plan de Trabajo durante estos **dos años de gestión**, los logros alcanzados en relación con los objetivos del Plan de Desarrollo y el cumplimiento de los compromisos asumidos en los presupuestos participativos. Además, incluye información financiera y una síntesis de las actividades administrativas.

Cada logro alcanzado refleja el esfuerzo articulado de todo el equipo humano que integra la **Prefectura de Bolívar**. Cada funcionario, personal técnico y administrativo ha contribuido de manera decidida al cumplimiento de los objetivos institucionales. Las obras ejecutadas y gestiones emprendidas constituyen avances concretos hacia la modernización institucional y el desarrollo territorial

sostenible.

El cambio que necesitamos es el que hemos venido construyendo con firmeza, entusiasmo y visión basado en pilares estratégicos, **mejoramiento de la red vial, el impulso a la producción agropecuaria con sistemas de riego fortalecidos y la protección del medio ambiente**. Estos ejes estructuran nuestra visión de desarrollo y representan nuestro compromiso permanente con la ciudadanía de Bolívar.

Bolívar no es solo un pequeño territorio en el mapa; es un inmenso paraíso verde, abrazado por majestuosas montañas, desde donde se vislumbra un sueño colectivo de progreso, desarrollo y bienestar para todos quienes vivimos en este mágico lugar.

Queridos amigos y amigas: sigamos caminando juntos, **Hombro a Hombro, por Bolívar y su gente**.

## Ing. Aníbal Coronel Monar

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR







## PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONSULTA CIUDADANA

<b>RENDICIÓN DE CUENTAS GADPB - EJERCICIO FISCAL 2024</b>	
<b>CONSULTA CIUDADANA</b>	
<b>ÁREA : VIALIDAD</b>	
<b>PREGUNTAS</b>	<b>RESPUESTAS</b>
1. Qué cantidad de asfalto se ha colocado en el año 2024 con el presupuesto de la Prefectura en los cantones: Caluma, Echeandía y Chimbo?	En el año 2024, se colocó 30.78 km de asfalto por un ancho 6.0 metros lineales corresponde a 184.692,00 metros cuadrados distribuidos en varias vías como: Vía Rayopamba-Facundo Vela y Vía Simiatug-Puenebata en el Cantón Guaranda, Asfaltado de la vía Telimbela – Caluma en el Cantón Caluma; y, Asfaltado de la San Francisco de Orongo - La Y - La Vaquera en el Cantón Echeandía.
2. La labor que viene desarrollando la Prefectura mediante Convenio con el MTOP para ejecutar algunas obras de arrastre entre ellas el asfalto de la vía Rayopamba - Facundo Vela, donde falta de terminar aproximadamente unos 8Km de asfalto, ejecutará la Prefectura el tramo que falta y cuándo?	Los trabajos de asfaltado de la vía Rayopamba - Facundo Vela en el tramo de las abscisa 15+400 a la abscisa 22+400 en una longitud de 7,2 km, se efectuarán por parte de la Prefectura de Bolívar mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para lo cual se realiza los estudios de Ingeniería correspondientes para efectuar los trabajos de colocación de asfalto, la obra se ejecutará cuando se disponga el presupuesto correspondiente por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
3. Cuál es el porcentaje de avance de las actividades planificadas como Presupuestos Participativos del año 2024 en las 19 parroquias y 3 cantones, los mismos que constan con el financiamiento respectivo de la Prefectura en cumplimiento del Art.71 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana?	El porcentaje de avance de los presupuestos participativos correspondientes a la Dirección de Vialidad es del 80.00 % en total según el siguiente desglose: Red Vial Rural Parroquia Julio Moreno: Guayrapata - Guantocoto - Atandagua; Red Vial Rural de la Parroquia San Lorenzo: Saucos - Naguan; Red Vial Rural de la Parroquia Simiatug: Cuatro Esquinas - Playapamba, Simiatug - Tablón, Simiatug - UE Felix Granja, Coliseo - Barrio - La Moya, Ingaloma, Mercado Nuevo, Estadio Pincipal - Via Mindina, Cashapamba; Red Vial Rural Parroquia La Magdalena: Cochabamba - Telimbela; Red Vial Rural de la Parroquia Telimbela, Cochabamba -Telimbela, Telimbela - San Vicente de las Tres Cruces; Red Vial Rural de la Parroquia Bilovan: Santa Ana - San Jorge - Cañotal en un 40%; Red Vial Rural de la Parroquia Balsapamba: Chiriyacu - Tronador en un 20%, Red Vial Rural Parroquia Regulo de Mora: Regulo de Mora -Changuil - San Jose del Tambo; Red Vial Rural de la Parroquia San José del Tambo: Luz Elvira, San Gabriel, San Francisco, Fortuna, Rosa Elvira, La Margarita - San José del Tambo; Red Vial Rural del Cantón Caluma, Red Vial Rural del Cantón Echeandía y Red Vial Rural del Cantón Las Naves.
4. Por ser la competencia de la Prefectura, es importante que se asfalte la Vía Santa Fe - Caluma, es una carretera alterna por donde transitan vehiculos con productos de la costa a la sierra, existe un estudio hecho por el MTOP en el año 2017, documento que puede ayudar en el proceso del trámite, la Prefectura tiene planificado ejecutar esta obra de gran importancia?	La Prefectura de Bolívar tiene planificado iniciar los trabajos de ampliación de vía Santa Fe - Caluma en el tramo Verdepamba - Pasagua de una longitud de 34.00 km en el mes de julio de 2025 y de manera simultánea se trabaja en la preparación de los informes técnicos para la actualización de los estudios de ingeniería elaborados por el MTOP e iniciar el trámite de financiamiento para la posterior contratación de la obra.
5. Es bueno saber que la Prefectura ejecutará la obra de asfalto de la Vía Salinas - Simiatug que tiene 22Km, cuándo iniciará los trabajos?	El contrato de rehabilitación de la vía Salinas - Simiatug, se suscribió el 27 de marzo 2025. Una vez se entregue el anticipo se iniciará la obra para lo cual se espera las asignaciones que el Gobierno Nacional a la Prefectura de Bolívar a través del Ministerio de Economía y Finanzas
6. La población de San Luis de Pambil están preocupados porque donde está ubicado el Puente bailey no está terminado los accesos al puente, Sr. Prefecto, le pedimos que se complete los trabajos en este sitio.	La Dirección de Vialidad realizó la construcción de los accesos al puente Bailey a nivel de base granular y de manera continua realiza la protección de los estribos del puente bailey. Además la Prefectura de Bolívar se encuentra realizando los estudios para la construcción de un puente nuevo de hormigón armado.
7. Cómo ha beneficiado la adquisición de la nueva maquinaria pesada y vehiculos para cumplir con las obras planificadas, actualmente con cuántos frentes de trabajo cuenta la Prefectura?	La Dirección de Vialidad cuenta actualmente con 11 frentes de trabajo con la adquisición de la nueva maquinaria se pudo incrementar dos frentes de trabajos para colocación de sub-base y base granular. Además se dispone de 2 excavadoras 390 para el dragado y protección de las riveras de los ríos.
8. Se culminó con las obras de arrastre de los años anteriores en las áreas de: Obras Públicas, Vialidad, Riego y otras áreas?	En el área de vialidad se ha ejecutado las obras de arrastre con un porcentaje de avance del 70.00%. Se encuentra pendiente realizar el asfaltado de la vía Caluma - Telimbela en una longitud de 8,4 kilómetros.
9. A través de la Mancomunidad mediante Convenio con el Municipio del Cantón Guaranda es satisfactorio observar la ejecución de 16 Km de asfalto en la Vía Larcaloma - Quinoacorral y otras comunidades, en esta obra cuál es el aporte de la Prefectura?	El Municipio del cantón Guaranda ejecuta el asfaltado de las vías del sector rural de la parroquia Guanajujo en base a un Convenio de Cooperación Interinstitucional y el aporte de la Prefectura de Bolívar es el mantenimiento rutinario y correctivo.
<b>FUENTE: Ing. Gustavo Pilamunga - DIRECTOR DE VIALIDAD</b>	

<b>ÁREA : ASESORÍA JURIDICA</b>	
<b>PREGUNTAS</b>	<b>RESPUESTAS</b>
1. Preocupados por la parte operativa y funcional de la Empresa Pública de Turismo, Entidad adscrita a la Prefectura, tomando en consideración que durante algunos años los gastos superan a los ingresos, resultados económicos que no son satisfactorios, la Prefectura puede realizar un Auditoría para determinar los resultados administrativos y financieros?	La Empresa Pública de Turismo cuenta con un Auditor Interno nombrado por el Directorio o por la Contraloría General del Estado, teniendo como objetivo y función auditar conforme lo determina el Art 21 de la ordenanza que regula su funcionamiento, tomando en cuenta que parte del Directorio es el Sr. Prefecto del GADPB; y que para la operación y mantenimiento de los centros turísticos el GADPB, asigna un presupuesto anual para los complejos recreacionales previa la presentación de programas y proyectos, por esta razón se vuelve imprescindible el control del manejo de los recursos financieros.
<b>FUENTE: Ab. Luis Guano - PROCURADOR SÍNDICO</b>	

ÁREA: TALENTO HUMANO	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Es posible conocer en el año 2024, cuántos empleados de la Prefectura han sido jubilados después de cumplir con sus años de trabajo de acuerdo a la ley, cómo se financió para cumplir con esta obligación</p>	<p>Durante el año 2024, cinco (5) empleados de la Prefectura de Bolívar han sido jubilados, una vez cumplidos los requisitos legales correspondientes. De estos, tres (3) servidores estaban sujetos al régimen del Código del Trabajo y dos (2) al régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).</p> <p>1.1. Jubilaciones bajo el Código del Trabajo</p> <p>Los tres trabajadores amparados por el Código del Trabajo accedieron a la jubilación patronal voluntaria, conforme a lo previsto en el artículo 188 de dicho cuerpo legal, tras haber cumplido los años de servicio exigidos por la norma y haber presentado su renuncia voluntaria, solicitando el reconocimiento del beneficio de jubilación.</p> <p>En estos casos, la terminación de la relación laboral se dio de mutuo acuerdo, conforme a las disposiciones legales, y las compensaciones económicas fueron calculadas según los parámetros establecidos por la ley. El financiamiento de estas compensaciones se realizó con recursos del presupuesto institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar, en cumplimiento de la obligación patronal.</p> <p>1.2. Jubilaciones bajo la LOSEP</p> <p>En cuanto a los dos servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), accedieron a la jubilación de forma voluntaria, conforme al artículo 129 de la LOSEP y el Reglamento General a la LOSEP, el cual regula el procedimiento para la jubilación con incentivo económico.</p> <p>Estas jubilaciones voluntarias fueron gestionadas y autorizadas por el Ministerio de Trabajo, y el incentivo económico correspondiente fue financiado con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a los mecanismos establecidos por el ente rector de las finanzas públicas.</p>
FUENTE: Ing. Richarf Hurtado.- DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	

ÁREA: COORDINACIÓN DE PREFECTURA	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Conocemos que la Prefectura con la colaboración de CONGOPE se firmó un Convenio con la Gobernación de Bolívar sobre Seguridad Ciudadana en nuestra Provincia, cuál es la participación que ha tenido la Prefectura y cuándo es el lanzamiento?</p>	<p>Se aclara que el convenio no se suscribe con la Gobernación, sino que corresponde al CONGOPE en coordinación con la Prefectura de Bolívar. Participación de la Prefectura: La Prefectura de Bolívar ha contribuido mediante apoyo logístico para talleres de socialización (infraestructura, sonido, proyección, etc.), entrega de información sobre sus servicios sociales —especialmente del IPASB, que inciden en temas de seguridad—, y acciones de coordinación de una posible creación de ordenanzas para la aplicación conforme a competencias en materia de seguridad y seguimiento para la implementación del plan. Además, se ha de participar en la firma del convenio, lo que implica corresponsabilidades, y se ha gestionado el trámite de validación ante el Ministerio del Interior.</p> <p>Lanzamiento: Desde el CONGOPE no se prevé un lanzamiento nacional. En la provincia, se realizará una presentación oficial una vez se complete la validación, posiblemente en una sesión del Consejo de Seguridad</p>
FUENTE: Sgto. Telmo Camacho - COORDINADOR PREFECTURA	



ÁREA: FINANCIERA	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Cuál es el valor total de las transferencias económicas realizadas en el año 2024 por parte de la Prefectura a la Empresa Pública de Turismo, recursos que permitieron cubrir las cuentas por pagas de años anteriores?	No se entregó recursos económicos para pago de años anteriores a la Empresa Pública en el año 2024, pero si se transfirió un valor de \$50.000,00; los cuales fueron destinados para el fortalecimiento a la empresa, adescantamiento, mantenimiento preventivo y correctivo del cableado estructurado, así como también para pintura en el interior de las piscinas.
2. Por las circunstancias de la Emergencia Vial, realizaron algunas reformas al Presupuesto Institucional de la Prefectura en el año 2024?	Si, en el mes de marzo del 2024 se realizó una reforma de traspaso previa Declaratoria de Emergencia 001-PP-GADPV-2024; mediante el cual se ejecutó el proceso de "Adquisición de armicos metálicos corrugada para la construcción de alcantarillas viales, malla electrosoldada y alambre galvanizado, para la reconstrucción de puentes y otras obras de emergencia provocado por la época invernal en la Provincia de Bolívar" por un valor de \$79,815,90.
FUENTE: Ing. Mauricio Chávez - DIRECTOR FINANCIERO	

ÁREA: PLANIFICACIÓN	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. De acuerdo al Plan de Trabajo enviado al Concejo Nacional Electoral - Delegación Bolívar, por parte del Sr. prefecto, cuál es el porcentaje que se ha cumplido de sus propuestas durante los dos años y qué expectativa tiene de los proyectos que están en proceso hasta culminar su periodo?	Hasta el momento se mantiene un avance del 52,99 % detallado de la siguiente manera EJE AMBIENTAL 66,00 % EJE ECONÓMICO 24,17%, EJE SOCIO-CULTURAL 64,29%, EJE POLÍTICO – INSTITUCIONAL 57,50 % , proyectandose un avance del 25 % en este Tercer año de mandato un 25 % y 25% en ultimo año dando un total del 100%.
FUENTE: Ing. Adrián Taco - Dirección de Planificación	



**ÁREA: OBRAS PÚBLICAS**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. En el presupuesto institucional 2024 de la Prefectura consta la construcción de 29 puentes en varios sectores de la Provincia, construcción de un puente mixto en la Parroquia Telimbela, construcción de cubiertas en varias comunidades, construcción de un estadio básico en Sabanetillas; de éstas obras cuántas se han ejecutado?</p>	<p>La Prefectura Provincial tenía un contrato para la construcción de 29 puentes carrozables. Sin embargo, por inconsistencias en el proyecto, y el incumplimiento de plazos y penalidades superiores al 5 %, se gestionó la terminación unilateral del contrato.</p> <p>Ante esta situación, y con base en los recursos disponibles, el señor Prefecto dispuso iniciar tres nuevos procesos contractuales para culminar tres puentes inconclusos dejados por la administración anterior. Uno de ellos, el puente mixto en la parroquia Telimbela que ya fue concluido al 100 % y entregado por el contratista. Actualmente, se espera la finalización de los accesos por parte de la Dirección de Vialidad para su entrega oficial a la comunidad.</p> <p>En cuanto a la obra del estadio básico en Sabanetillas, planificada para el año 2024, se adjudicó el contrato y está en trámite el anticipo. Mientras tanto, se realizan trabajos de relleno y nivelación del terreno como preparación para el inicio de la construcción.</p>
<p>2. Cuál es el porcentaje de avance de las actividades planificadas como Presupuestos Participativos del año 2024 en las 19 parroquias y 3 cantones, los mismos que constan con el financiamiento respectivo de la Prefectura en cumplimiento del Art.71 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana?</p>	<p>En lo que respecta a la ejecución de obras bajo el esquema de presupuestos participativos 2024, la Dirección de Obras Públicas tenía a su cargo las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parroquia Santa Fe. - Construcción de una alcantarilla en el sector Verde Pamba, obra concluida al 100 %.</li> <li>• Parroquia San Simón, se cumplió con la entrega total de materiales para el drenaje del estadio básico, obra que será ejecutada próximamente. La entrega se lo hizo directamente al Presidente del GAD Parroquial.</li> <li>• Parroquia Santiago. - Se encuentra en ejecución la construcción de un graderío de 66 metros de largo por 5 metros de ancho. El proyecto registra un avance físico del 60 %.</li> <li>• Parroquia San Sebastián. - Construcción de cabezales y una alcantarilla en el sector definido por el Sr. Presidente del GAD Parroquial. El avance a la presente fecha es del 70 % y se prevé su culminación para el 30 de mayo de 2025.</li> <li>• Parroquia San Luis de Pambil. - Estuvo contemplado la entrega de materiales para la construcción del Puente Colgante. No obstante, en coordinación entre el señor Presidente del GAD Parroquial y el señor Prefecto, se ha acordado apoyar con la ejecución de la obra.</li> </ul>
<p>3. Tomando en cuenta que el puente ubicado en el Río Gradas esta en malas condiciones, por donde circulan vehículos y la población de varias comunidades del sector Veintimilla, la Prefectura puede hacer la intervención oportuna para que se construya un nuevo puente?</p>	<p>El puente de gradas en el sector de Veintimilla resultó afectado por la reciente temporada invernal. Tras realizar las inspecciones técnicas correspondientes, se ha determinado la viabilidad de construir un nuevo puente utilizando tubería entregada por Petroecuador, obtenida gracias a las gestiones del señor Prefecto.</p> <p>Esta nueva infraestructura será de gran utilidad para varias comunidades del sector, ya que contará con una luz aproximada de 18 metros. Dado que ya se dispone de los materiales necesarios, la obra será ejecutada mediante administración directa.</p>
<p>4. Cómo ha beneficiado la adquisición de la nueva maquinaria pesada y vehículos para cumplir con las obras planificadas, actualmente con cuántos frentes de trabajo cuenta la Prefectura?</p>	<p>Gracias a la adquisición de nuevos vehículos por parte de la Prefectura, se ha logrado mitigar en gran medida un problema crítico relacionado con el transporte de las cuadrillas de trabajo hacia los distintos sectores de la provincia. Actualmente, se cuenta con seis cuadrillas conformadas por albañiles y peones, además de una cuadrilla de pintores y otra de soldados.</p> <p>Si bien aún no se ha solucionado al 100 % la falencia en movilidad, la incorporación de estos vehículos ha permitido mejorar significativamente la operatividad de los equipos de trabajo.</p> <p>En cuanto a maquinaria pesada, la Dirección de Obras Públicas dispone únicamente de una retroexcavadora y una volqueta, las cuales sirven para abastecer de material a los distintos frentes. No obstante, se ha planteado al señor Prefecto la necesidad de incorporar una retroexcavadora adicional, con el fin de atender de manera más efectiva los trabajos de calce de puentes, una intervención urgente en varios puntos del territorio provincial.</p>
<p>5. Se culminó con las obras de arrastre de los años anteriores en las áreas de: Obras Públicas, Vialidad, Riego y otras áreas?</p>	<p>Como Dirección de Obras Públicas, hemos culminado los proyectos pendientes de la administración anterior, entre ellos la construcción de 17 cubiertas ejecutadas por el contratista, Ing. Rea y 6 cubiertas contratadas por el Ing. Richard Paliz.</p> <p>En cuanto al Plan Puentes, que quedó inconcluso en la gestión anterior, hemos informado en la pregunta No. 1, sin embargo, nos ratificamos indicando que se ha dado por terminado el contrato debido a las falencias detectadas, pero hemos asumido el compromiso de ejecutar tres nuevos procesos para la construcción de puentes, los cuales ya se encuentran en marcha.</p>

FUENTE: Arq. Renato García - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ÁREA: RIEGO	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. En lo que se refiere a las construcciones de 9 sistemas de riego planificados para el año 2024 en varios sectores, cuántos están terminados y dando servicio a la población beneficiada?</p>	<p>De los nueve sistemas de riego planificados para el año 2024 en distintos sectores de la provincia, varios ya han sido terminados y actualmente están brindando servicio a la población beneficiada, sumando un total de 145.67 hectáreas incorporadas al riego, lo que representa un importante avance en la ampliación de la frontera agrícola provincial.</p> <p>En cuanto al estado de los sistemas restantes:</p> <p>Los proyectos en Ungubí, Quindigua, Atandahua y Laygua se encuentran en proceso de construcción, registrando un avance físico de obra superior al 70%, lo cual indica que están próximos a su finalización.</p> <p>Por otro lado, los sistemas previstos en Yacubiana y Rioblanco San Simón no pudieron ser ejecutados debido a la falta de asignación presupuestaria por parte del gobierno central, situación que ha limitado el cumplimiento total de la planificación inicial.</p> <p>La Dirección de Riego continúa trabajando para garantizar el cumplimiento del cronograma de obras y buscar alternativas de financiamiento que permitan avanzar con los sistemas pendientes.</p>
<p>1. Están avanzando con el trámite del pedido de la Comunidad de Cachisagua sobre la construcción de un canal de riego, tomando en cuenta que es un sector muy productivo, el área de riego tiene planificado realizar esta obra y en qué tiempo?</p>	<p>Sí, se está avanzando con el trámite del pedido realizado por la Comunidad de Cachisagua respecto a la construcción del canal de riego. Reconociendo que se trata de un sector altamente productivo, el área de riego ha planificado la ejecución de esta obra como parte de sus prioridades.</p> <p>Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de adjudicación para la adquisición de materiales, lo cual es un paso clave dentro del cronograma previsto. Una vez concluido este proceso, la obra será ejecutada por administración directa a cargo de la Dirección de Riego de la Prefectura de Bolívar.</p> <p>Este proyecto representa un compromiso institucional para fortalecer la infraestructura hídrica de la zona y contribuir al desarrollo agrícola de la comunidad</p>
<p>FUENTE: Ing. Dani Chela - DIRECTOR SEC. RIEGO Y DRENAJE</p>	

ÁREA: MEDIO AMBIENTE	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Por los cambios bruscos del clima en el verano, exhortamos que mediante ordenanza, la Prefectura trate de prevenir los incendios forestales en los páramos y en el subtrópico para evitar que se destruya la flora y fauna, se debe conservar las vertientes de agua, concientizando a la población a través de charlas de prevención, la área de Medio Ambiente está en posibilidad de realizar estas acciones?</p>	<p>Como GADPB, hemos establecido una política pública orientada a la creación de un Área de Conservación y Uso Sustentable en el ecosistema de páramo y estribaciones de montaña. Esta iniciativa tiene como objetivo gestionar y ordenar el territorio a través de una producción sostenible, priorizando la protección de los servicios ecosistémicos.</p> <p>Dentro de este mecanismo de conservación, se contempla un Plan Técnico de Manejo que aborda problemáticas específicas de estos ecosistemas frágiles, como la quema agrícola. En este contexto, se ha conformado una mesa intersectorial de articulación provincial denominada "Mesa por la Tierra, el Agua y el Ambiente", la cual integra estrategias, programas y proyectos desarrollados por instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional.</p> <p>Entre las acciones principales se incluyen campañas de sensibilización y educación ambiental sobre la prevención de incendios forestales. Estas actividades se han venido implementando a través de las mesas intersectoriales parroquiales, en coordinación con líderes y representantes de distintas comunidades.</p> <p>La Secretaría de Gestión Ambiental y Riesgos del GADPB cuenta con las capacidades técnicas y operativas para llevar a cabo estas acciones de manera efectiva, promoviendo la conservación de la flora, la fauna y las fuentes de agua en nuestra jurisdicción.</p>
<p>FUENTE : Ing. Paúl Velasco - Director Medio Ambiente</p>	



ÁREA: ECONÓMICO PRODUCTIVO (TURISMO)	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Se ha planificado la inversión de \$400.000,00, en el mejoramiento del Lago Las Cochas para fortalecer el turismo de la Provincia; el Sr. Prefecto, está considerando el mejoramiento del Parque Acuático de Balsapamba?. También recomendamos se integre a San Luis de Pambil , Rcto. Campo Bello, donde existen vestigios de geroglíficos, Piedra Blanca donde existe una cascada.</p>	<p>La inversión realizada en la Empresa Pública de Turismo asciende a \$114.296,89, recursos que han sido destinados principalmente al mantenimiento y mejoramiento de los complejos turísticos:</p> <p>Parque Acuático Josefina Barba, ubicado en Balsapamba.</p> <p>Lago Las Cochas, en la parroquia Guanujo, donde se ejecutó la colocación de 4.400 m<sup>2</sup> de doble riego asfáltico, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y optimizar los servicios que ofrecen estos dos centros turísticos.</p> <p>En cuanto a los atractivos turísticos de la parroquia San Luis de Pambil, informamos que la Prefectura, a través de la Jefatura de Turismo, se encuentra realizando un levantamiento de información técnica. Esta acción permitirá identificar las necesidades específicas de intervención y gestionar su incorporación en el presupuesto institucional del próximo año.</p>
FUENTE: Lic. Heriberto Díaz - Jefatura de Turismo	

ÁREA: ECONÓMICO PRODUCTIVO (Cultura)	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. El trabajo que viene haciendo la Dirección de Cultura a través de las visitas a las Casas Patrimoniales resaltando la antigüedad y su historia, de igual forma los eventos musicales denominados: Por los Caminos de Bolívar", se continuarán estas acciones replicando en otros lugares de la Provincia?.</p>	<p>El proyecto "Por los Caminos de Bolívar, Arte y Cultura", se lo viene desarrollando en todas las parroquias de la Provincia y este año 2025 ya iniciamos con nuestro recorrido por los cantones.</p> <p>El Proyecto "Arte y Patrimonio" lo iniciamos en el año 2024 y lo estamos desarrollando en el año 2025, ya hemos visitado dos Santuarios Patrimoniales (Chimbo y Guanujo) y hemos aperturado dos casas patrimoniales en la ciudad de Guaranda: Casa del Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar, y la casa de la Sociedad Artística de Bolívar. el Proyecto continuará hasta el año 2027.</p>
FUENTE: Lic. Marco Dávila - DIRECTOR DE CULTURA	









PREFECTURA DE  
BOLÍVAR



HOMBRO A HOMBRO

20  
24 de *Rendición*  
CUENTAS

# RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2024

En cumplimiento del **artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana**, que establece la obligación de todas las instituciones del sector público de rendir cuentas de manera periódica, oportuna, clara y veraz, presentamos el informe de gestión correspondiente al año 2024.

Este acto responde también al mandato constitucional establecido en el **artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador**, que promueve la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, y al **artículo 50, literal (U) del COOTAD**, que dispone que los gobiernos autónomos descentralizados deben informar y rendir cuentas de su gestión ante la ciudadanía de manera transparente y participativa.

En esta tierra donde se alza majestuosa la Cordillera de los Andes, una de las más hermosas del mundo, la minga constituye el alma solidaria de los pueblos bolivarenses. Es el cimiento y motor de lo que somos y de lo que soñamos juntos como provincia.

Donde el trabajo colaborativo simboliza la esperanza y abre caminos hacia un futuro promisorio, desde la Prefectura de Bolívar nos proyectamos hacia el desarrollo integral, comprometidos con una **provincia sostenible, de oportunidades y bienestar para todos**, enmarcando nuestras acciones en los objetivos de desarrollo provincial y los principios de equidad, solidaridad y justicia social.

Inicio este informe con el eje considerado el de mayor importancia para el desarrollo integral de la Provincia.





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

Secretaría <sup>DE</sup>  
**VIALIDAD**

# VIALIDAD

Durante el año 2024, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar ha intervenido en **881,74 kilómetros de la red vial**, fomentando el desarrollo turístico, agrícola y productivo de la provincia, con una inversión de USD **\$4.502.452,03**.

De los cuales por Administración Directa corresponde a **\$2.691.377,03**, y por Contratación son un monto de **\$1.811.075,00**.

Se destacan **32,18 kilómetros de vías asfaltadas**, correspondientes a los siguientes tramos:

- Rayopamba – Facundo Vela (6.58 km)
- Telimbela – Caluma (9,00 km)
- Simiatug - Puenebata (11.6 Km)
- San Francisco de Orongo – La Y – La Vaquera, en el cantón Echeandía (5,00 km)

Se ha cumplido un anhelo histórico con la apertura de **20,5 km de nuevas vías**, la construcción de **4,5 km de cajoneras**, el lastrado de **185,93 km de vías**, y el mantenimiento de **612,93 km**, distribuidos en diferentes cantones y parroquias.

Para mitigar los efectos de la temporada invernal, se realizaron trabajos preventivos de desazolve y muros de escollera en aproximadamente **26,28 km** de vías en sectores como San José del Tambo (Chillanes), San Luis de Pambil (Guaranda), Echeandía, Caluma y Las Naves. También se colocaron **puentes tipo Bailey** en los sectores de Santanderiana (San José del Tambo) y San Luis de Pambil.

Asimismo, se entregaron **1.300 galones mensuales de diésel industrial** a las 19 juntas parroquiales, alcanzando un total de **24.700 galones en 2024**, con el compromiso de mantener este apoyo durante 2025, evitando así la paralización de trabajos e inversiones que se realizan por faldas a la ciudad de los



CANTÓN	PARROQUIAS	KILÓMETROS DE ÁREA INTERVENIDA TOTAL
Guaranda	Veintimilla	4
	Guanujo	53,2
	Facundo Vela	44,30
	Julio E. Moreno	10
	Salinas	55
	San Lorenzo	15
	San Simón	8,70
	Santa Fe	18
	Simiatug	45,10
	San Luis de Pambil	62
	Telimbela	4,30
San Miguel	San Miguel	6,30
	Balsapamba	46,80
	Bilován	45,40
	Régulo de Mora	65
	San Pablo de Atenas	37,20
	Santiago	31,40
	San Vicente	51
Chillanes	San José del Tambo	56,43
Caluma	VARIOS SECTORES	8,80
Echeandía	VARIOS SECTORES	46,30
Las Naves	VARIOS SECTORES	87,25
	TOTAL KM	881,74

Fuente: Secretaría de Vialidad 2024

VIALIDAD AÑO 2024										
# CANTÓN	PARROQUIAS	PROYECTOS VIALES	TIPO DE ACTIVIDAD	KM DE VÍA INTERVENIDA	TIPO DE VÍA INTERVENIO	MONTO INVERSIÓN (FIJADO EN EL POA)	TIPO DE INTERVENCIÓN	STATUS	% DE AVANCE	
Guaranda	Ángel Polibio Chávez	Reasfalto/ Rasanteo Y Limpieza de Cunetas/ Vía Cascehes-Herapamba	RELASTRADO/RASANTEO/ LIMPIEZA DE CUNETAS/		LA STRADA	\$ 24.022,64	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
	Ventimilla	Limpieza de Cunetas Vía Que Conduce a Guano Cruz/ desde La Vía Principal Guaraju-Echanda	LIMPIEZA DE CUNETAS	3,00	LA STRADA	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Lastrado En La Comunidad Sinche Chico	LIMPIEZA DE CUNETAS / LASTRADO	7,00	LA STRADA	\$ 22.229,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Lastrado/ Limpieza de Cunetas En La Vía Piscocero-Rumpungo	LIMPIEZA DE CUNETAS / LASTRADO	8,70	LA STRADA	\$ 43.030,20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Lastrado de La Vía Culébilas-Pachakurik	LASTRADO	7,40	LA STRADA	\$ 30.569,40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Bacheo Con Asfalto En Frio Vía Las Cochas	LIMPIEZA DE CUNETAS/ BACHEO CON ASFALTO	5,00	ASFALTADA	\$ 11.912,44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas 4 Esquinas-Vía Salinas	LIMPIEZA DE CUNETAS	4,00	ASFALTADA	\$ 3.260,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Sector de Chalata Dragado del Río	DRAGADO DE RIO / LIMPIEZA DE CUNETAS	2,00	LA STRADA	\$ 23.722,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Relastro de La Vía Totomas-San Juan de Llullungo	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	4,50	LA STRADA	\$ 16.060,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de derrumbes Vía Calcloma-Milagros-Totonas	LIMPIEZA DE DERRUMBES	0,80	SUELO NATURAL	\$ 1.764,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Nueva Variante/ Rasanteo/ Sector de Musallata	NUOVA VARIANTE/ RASANTEO	5,60	SUELO NATURAL	\$ 7.722,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Apertura de Vía Padre Urco	APERTURA DE VÍA	0,80	SUELO NATURAL	\$ 6.864,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Colocación de Doble Tratamiento Superficial Bituminoso (Dtsb)/ Recinto Ferrial Lago Las Cochas	COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (DTSB)	0,40	SUELO NATURAL	\$ 21.756,09	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
Guaranda		Limpieza de Cunetas Vía Talhua-Rayopamba-Facundo Vela	LIMPIEZA DE CUNETAS	32,00	ASFALTADA	\$ 26.080,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de deslizamiento Km 32/ Vía Rayopamba-Facundo Vela	LIMPIEZA DE DERRUMBES	0,30	SUELO NATURAL	\$ 1.764,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Asfaltado de la vía Vía Rayopamba-Facundo Vela	ASFALTADO	6,58	ASFALTADA	\$ 518.991,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%	
		Construcción de Cajoneras Sector Aseradero-La Orqueta	CONSTRUCCIÓN DE CAJONERAS	4,00	ASFALTADA	\$ 18.810,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	60%	
		Limpieza de Cunetas/ Mejoramiento Vía Sector Ponguito-Maguan Loma/ Playas de Margarita	LIMPIEZA DE CUNETAS	8,00	SUELO NATURAL	\$ 36.308,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Relastro de La Vía/ Guayrapata-Sumpamba-Rodeo-Cashapamba-Y Guayrapata-Corralpamba-Rodeo/Cashapamba-Guayrapata	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	10,00	LA STRADA	\$ 49.460,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Relastro de La Vía Tiguiñal-Pachancho-El Arenal	RELASTRADO	18,00	LA STRADA	\$ 89.028,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Ampliación/ Construcción de Cajoneras Vía Salinas-Pambahué-Los Arroyos-La Palma-Mulidiguan-Monoloma-Matavi-Tigre Urco-Tres Marías-Chazo Juan	AMPLIACIÓN DE VÍA CONSTRUCCIÓN DE CAJONERAS	25,00	LA STRADA	\$ 36.858,80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	40%	
		Bacheo Con Material de Lastre de La Vía Salinas-Simatug	BACHEO CON LASTRE	12,00	LA STRADA	\$ 19.860,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Rasanteo/ Vía Convención-San Simón-La Baten-San Lorenzo	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	9,00	ASFALTADA	\$ 7.335,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Limpieza de Cunetas/ Relastro de La Vía Saucos-Nahuan	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	6,00	LA STRADA	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	
		Trabajos de Relastro de La Vía San Simón-Shacundo-Capitio-Puruhan	RELASTRADO	8,70	LA STRADA	\$ 20.908,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	45%	
		Limpieza de Cunetas/ Relastro Vía Santa Fe-Verdepamba-Simpimónias	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	18,00	LA STRADA	\$ 41.760,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%	

Comunidad	Descripción de la obra	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Estado	Porcentaje de Ejecución
Santa Fe	Limpieza de Cunetas/ Relastroado Vía Santa Fe-Verdepamba-Simpi-Monjas	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	LASTRADO	18,00	\$ 41.700,00	\$ 750.600,00	FINALIZADA	100%
	Conformación de La Vía/ Previa A La Colocación de Carpeta Asfáltica/ Vía Simiatug-Pueñebata-Germana	CONFORMACIÓN DE VÍA - PREVIA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	LASTRADO	12,00	\$ 89.592,00	\$ 1.075.104,00	FINALIZADA	100%
	Asfaltado de la vía Vía Simiatug-Pueñebata	ASFALTADO	ASFALTADA	11,60	\$ 612.540,00	\$ 7.105.464,00	FINALIZADA	100%
	Vía Sector Chahapamba Junto A La Plaza de Animales Ensamble Recreación/ Construcción de Cajoneras	CONSTRUCCIÓN DE CAJONERAS	LASTRADO	0,50	\$ 3.217,50	\$ 1.608,75	FINALIZADA	100%
	Relastroado/ Conformación/ Limpieza de Cunetas de La Vía Simiatug-4 Esquinas-Playapamba	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	LASTRADO	3,50	\$ 17.311,00	\$ 60.588,50	FINALIZADA	100%
	Relastroado Limpieza de Cunetas/ Vía Simiatug-El Tablón	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RELASTRADO	LASTRADO	1,20	\$ 5.935,20	\$ 7.122,24	FINALIZADA	100%
	Limpieza de derrumbes En La Vía Cutahua	LIMPIEZA DE DERRUMBES	SUELO NATURAL	0,40	\$ 1.176,00	\$ 470,40	FINALIZADA	100%
	Limpieza de Cunetas/ Lastrado de Las Calles/ Centricas: Simiatug-U.F. Félix Granja Coliseo Barrio La Moza/ Inga Loma/ Mercado Nuevo/ Estado Principal Vía Mindina	LIMPIEZA DE CUNETAS/ LASTRADO DE CALLES CENTRICAS	LASTRADO	2,00	\$ 9.892,00	\$ 19.784,00	FINALIZADA	100%
	Limpieza de Cunetas/ Tendido de Material Vía Simiatug-Moisan	LIMPIEZA DE CUNETAS/ TENDIDO DE MATERIAL	LASTRADO	1,50	\$ 7.419,00	\$ 11.128,50	FINALIZADA	100%
	Vía San Vicente-Playapamba/ Limpieza de Cunetas/ Tendido de Material	LIMPIEZA DE CUNETAS/ TENDIDO DE MATERIAL	LASTRADO	2,00	\$ 9.892,00	\$ 19.784,00	FINALIZADA	100%
Simiatug	Chugur-San Francisco-La Cabaña-Tacarpo-El Candio-Santa Teresa/ Limpieza de Cunetas/ Tendido de Material	LIMPIEZA DE CUNETAS/ TENDIDO DE MATERIAL	LASTRADO	22,00	\$ 42.575,00	\$ 936.650,00	FINALIZADA	100%
	Rebacheo de La Vía Guagrauco-La Variante-San Luis de Pambil	REBACHEO	LASTRADO	8,00	\$ 34.000,00	\$ 272.000,00	FINALIZADA	100%
	Vía La Libertad-La delicia-Campo Bello-Cruce de Tabimal-La Venada-La Variante/ Rebacheo Y Limpieza de Cunetas	LIMPIEZA DE CUNETAS/ REBACHEO	LASTRADO	18,00	\$ 76.635,00	\$ 1.379.430,00	FINALIZADA	100%
	Vía Piedra Blanca-San Luis de Pambil Rebacheo Y Limpieza de Cunetas	LIMPIEZA DE CUNETAS/ REBACHEO	LASTRADO	5,00	\$ 21.287,50	\$ 106.437,50	FINALIZADA	100%
	Rebacheo de La Vía El Porvenir-San Luis de Pambil	REBACHEO	LASTRADO	6,00	\$ 25.545,00	\$ 153.270,00	FINALIZADA	100%
	Rebacheo de La Vía Bellavista-La Libertad-San Luis de Pambil	REBACHEO	LASTRADO	8,00	\$ 34.000,00	\$ 272.000,00	FINALIZADA	100%
	Lastrado de Uno de Los Accesos/ Al Puente María Aurora	LASTRADO	LASTRADO	0,30	\$ 7.102,50	\$ 2.130,75	FINALIZADA	100%
	Limpieza de Cunetas Y Rasanteo de La Vía Suquivi-San Luis de Pambil	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RASANTEO	LASTRADO	13,00	\$ 55.347,50	\$ 720.517,50	FINALIZADA	100%
	Encauzamiento de Río Sector Barrio Nuevo	DRAGADO DE RIO	SUELO NATURAL	0,40	\$ 9.460,00	\$ 3.784,00	FINALIZADA	100%
	Limpieza de Cunetas/ Rasanteo Y Reconformación de Las Calles de La Ciudadela Y Barrios de La Parroquia Ciudadela Dolores Poveda-Vigen del Cisne-Nuevos Horizontes Y Los Barrios Paraiso-La Central-Diño Niño	LIMPIEZA DE CUNETAS/ RASANTEO	LASTRADO	2,00	\$ 17.452,00	\$ 34.904,00	FINALIZADA	100%
San Luis de Pambil	Encauzamiento de Río/ Protección del Puente Aguas-Ariba. Abajo Y Mizado de Material Para La Recuperación de La Plataforma de La Vía del Sector de Pecos-San Fernando-Río Blanco.	DRAGADO DE RIO	DES AZOLVE	0,80	\$ 34.074,00	\$ 27.259,20	FINALIZADA	100%
	Encauzamiento del Río San Luis de Pambil/ desde El Puente Bayle-Puente Cado	DRAGADO DE RIO	DES AZOLVE	0,50	\$ 22.510,00	\$ 11.255,00	TRABAJANDO	40%



RECONFORMACIÓN Y VARIANTE DE LA VÍA QUIBRACHA - MATAPALO	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	1,70	LASTRADA	\$ 5.852,25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA DE CUNETAS SAN FRANCISCO - EL RODEO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	1,50	LASTRADA	\$ 5.163,75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de derrumbos APERTURA de LA VÍA COMO CRUZ - CAÑOTAL	LIMPIEZA DE DERRUMBES	APERTURA	6,00	SUELO NATURAL	\$ 51.480,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA TINGO - MUÑA	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	3,00	LASTRADA	\$ 10.327,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN LIMPIEZA de CUNETAS CAÑOTAL - LA PLANCHA	RECONFORMACIÓN DE VÍA / LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	4,00	LASTRADA	\$ 13.770,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA REGULO de MORA CHANGUIL-MEDIO	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	7,00	LASTRADA	\$ 8.557,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	75%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA REGULO de MORA - SAN VICENTE	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	15,00	LASTRADA	\$ 7.335,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	60%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA SAN VICENTE - SAN JORGE	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	LASTRADA	\$ 3.423,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	80%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA REGULO de MORA - CHOTAPAMBA	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	8,00	SUELO NATURAL	\$ 13.692,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	50%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA REGULO de MORA - CONSUELO	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	8,00	EMPEDRADA	\$ 16.524,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	90%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA LAS GUARDIAS - REGULO de MORA	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	12,00	ASFALTADA	\$ 5.868,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	70%
RECONFORMACIÓN de LA VÍA REGULO de MORA - VAINILLAS	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	7,00	LASTRADA	\$ 3.423,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	75%
ENSANCHE Y APERTURA de LA VÍA SAN JORGE - SAN VICENTE	ENSANCHE / APERTURA	APERTURA	6,00	SUELO NATURAL	\$ 68.640,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TRABAJANDO	50%
LIMPIEZA de derrumbes VÍA VILLAMORA	LIMPIEZA DE DERRUMBES	MANTENIMIENTO VIAL	0,40	LASTRADA	\$ 1.287,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de derrumbes VÍA SAN RAMÓN - SICOTO	LIMPIEZA DE DERRUMBES	MANTENIMIENTO VIAL	0,20	LASTRADA	\$ 965,25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de derrumbes VÍA LOMA de TABLAS - PUERTAS de L CIELO	LIMPIEZA DE DERRUMBES	MANTENIMIENTO VIAL	1,00	LASTRADA	\$ 3.127,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
CARGADO de LA MINA de PEREZAN	TRANSPORTE DE MATERIAL	MANTENIMIENTO VIAL	0,50	LASTRADA	\$ 1.608,75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS VÍA PUMAMAQUITBAJO - SANTIAGO PAMBA	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	7,20	LASTRADA	\$ 24.786,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS VÍA SANTIAGO PAMBA - PUCARA - GUAMALAN ALTO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	6,00	LASTRADA	\$ 20.655,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN VÍA LOMAPAMBA - PUCARA	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	3,00	LASTRADA	\$ 10.327,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN VÍA RUMIPAMBA - LOMA de TABLAS	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	8,00	LASTRADA	\$ 27.540,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN VÍA EL TORNO - CUITORO - ALUZANA	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	6,40	LASTRADA	\$ 22.032,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN MORAS PAMBA - ACHUPALLAS	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	4,50	LASTRADA	\$ 15.491,25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS EN LA VÍA SANTIAGO - TOTORAS	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	17,80	ASFALTADA	\$ 21.760,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN EN LA VÍA AMBROSIO LASSO	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	4,00	LASTRADA	\$ 7.314,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN EN LA VÍA LAS ANTENAS	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	0,40	LASTRADA	\$ 792,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN EN LA VÍA CEBADAPAMBA - LA ENTRADA	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	0,40	LASTRADA	\$ 731,40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN EN LA VÍA EL MIRADOR	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	1,50	LASTRADA	\$ 2.970,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
RECONFORMACIÓN EN LA VÍA SAN FRANCISCO	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	2,70	ASFALTADA	\$ 3.300,75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS TENDIDO Y COMPACTADO EN LA VÍA LA PUNTIJA - CRUZ de LIZO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,10	LASTRADA	\$ 4.476,15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS TENDIDO Y COMPACTADO EN LA VÍA CRUZ de LIZO - PITIATAN	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,50	LASTRADA	\$ 5.328,75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS CHASQUI-CAHUICHE	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	6,00	ASFALTADA	\$ 7.335,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
LIMPIEZA de CUNETAS SAN VICENTE - SAN JACINTO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	3,00	ASFALTADA	\$ 4.278,75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%

San Miguel

Régulo de MORA

San Pablo de Atenas

Santiago

San Vicente	LIMPIEZA DE CUNETAS SAN JACINTO - LIZO CHICO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	ASFALTADA	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS LIZO CHICO - LIZO GRANDE	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	ASFALTADA	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS LIZO GRANDE - TATAHUZO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	SUELO NATURAL	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS TATAHUZO - SAPAN	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	SUELO NATURAL	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS SAPAN - SAN LUIS de UNGUBI	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	6,00	ASFALTADA	\$ 7.335,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS SAN LUIS de UNGUBI - RIO CAÑI	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	3,00	ASFALTADA	\$ 3.667,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS CHUMIQUIRO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	3,00	LA STRADA	\$ 3.667,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS SAN LUIS de UNGUBI - SAN RAMON	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	EMPEDRADA	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS MIRAFLORES - SAN LUIS de UNGUBI	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	2,00	EMPEDRADA	\$ 2.445,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS TATAHUZO - SAN JACINTO - TOLA HURCO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	4,00	SUELO NATURAL	\$ 4.890,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS SAN VICENTE - UNGUBI	LIMPIEZA DE CUNETAS	MANTENIMIENTO VIAL	14,00	ASFALTADA	\$ 17.115,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%

	Sector El Recreo – Naranjal – San José del Tambo: Limpieza de derrumbes y cargado de escombros.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	2,20	LASTRADA	\$ 352,80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Recinto La Ucay: construcción de muros de escollera junto al puente bañe – cargado de material – dragado del Río Chimbo	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,20		\$ 8.670,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
	Río Añío - Recinto Santanderiana: Dragado del río Añío/ cargado de material y conformación de muros de protección de puente/ aguas arriba - aguas abajo del puente.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,25		\$ 10.837,50	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
	Río Añío - Recinto Santanderiana: Instalación de estructura del puente bañe – construcción de muro para proteger los muros de ala del puente de escollera con piedra grueso del río Carzón/ Angélica.	INSTALACIÓN DE PUENTE/BAÑE/ MURO DE ESCOLLERA	MANTENIMIENTO VIAL	0,23		\$ 9.970,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Río Añío - Recinto Santanderiana: dragado en tres puntos aguas arriba del puente para evitar que el río ingrese al poblado de la Angélica.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,30		\$ 13.734,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
	Vía en el Recinto La Miran Alto - Bajo – La Esperanza: limpieza de derrumbes/ – excavación e instalación de tubería para aguas lluvias/ minado de material.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	16,00	LASTRADA	\$ 705,60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Vía en el Recinto La Miran Alto - Bajo – La Esperanza: conformación para recuperación de plataformas con badenes – excavación e instalación de tubería para aguas lluvias/ minado de material.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	1,20	LASTRADA	\$ 3.024,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Río Marcelino en +. Muros de protección El Recinto La Rosita: Dragado de río + muro de protección	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,40		\$ 10.837,50	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
	Vía Dulcepamba - Limón: Limpieza de derrumbe + desalojo en volquete.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	2,80	LASTRADA	\$ 588,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Vía Chillanes – San Vicente: Limpieza de derrumbe + desalojo en volquete.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	6,00	ASFALTADA	\$ 646,80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Vía San Vicente – La Margarita: Limpieza de derrumbe + desalojo en volquete.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	2,80	LASTRADA	\$ 529,20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Sector Valparaíso Estero de Damas el Rosario y la Rosita: Dragado de ríos y protección con muros escollera	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,35		\$ 30.345,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
	Vía del Recinto Colombia Alta: Limpieza de cunetas/ conformación y bacheo con material de mina.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	4,50	LASTRADA	\$ 586,80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Chillanes	Dragado río Changuil – sector Dulcepamba: conformación de muro para proteger la plataforma de la vía	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,40		\$ 28.900,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%

San José del Tambo

Vía Vainillas - San José del Tambo: Limpieza de cunetas/ conformación y bacheo con material de mina.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	3,80	LASTRADA	\$ 495,52	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Vía La Fortuna - Yainillas/ Parroquia San José del Tambo: Limpieza de cunetas/ conformación y bacheo con material de mina.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	4,50	LASTRADA	\$ 586,80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Dragado del Río Changuil – Barrio La Terecita - San José del Tambo: cargado de material para la construcción de muros de escollera	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DESAZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,40		\$ 23.120,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
Vía La Chontayacu - San José del Tambo: Limpieza de cunetas/ conformación y bacheo con material de mina.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	3,60	LASTRADA	\$ 469,44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Vía San Pablo de Amali - San José del Tambo: Limpieza de cunetas/ conformación y bacheo con material de mina.	LIMPIEZA DE CUNETAS / BACHEO/ DERRUMBOS	MANTENIMIENTO VIAL	6,50	LASTRADA	\$ 847,60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
<b>(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL) La Pesquería - Matapalo - San Francisco:</b> Limpieza de cunetas, conformación y bacheo con material de mina.	(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL)	MANTENIMIENTO VIAL	11,70	LASTRADA	\$ 30.888,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
<b>(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL) Matapalo - Santa Rosa de Cerillos:</b> Limpieza de cunetas, conformación y bacheo con material de mina.	(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL)	MANTENIMIENTO VIAL	4,58	LASTRADA	\$ 12.091,20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
<b>(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL) Santa Rosa Cerillos - Naranja Loma - Vía a San Jose Del Tambo:</b> Limpieza de cunetas, conformación y bacheo con material de mina.	(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL)	MANTENIMIENTO VIAL	6,25	LASTRADA	\$ 16.500,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
<b>(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL) Matapalo - San Vicente:</b> Limpieza de cunetas, conformación y bacheo con material de mina.	(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL)	MANTENIMIENTO VIAL	9,05	LASTRADA	\$ 23.892,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
<b>(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL) Matapalo - San Francisco:</b> Limpieza de cunetas, conformación y bacheo con material de mina.	(CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL)	MANTENIMIENTO VIAL	3,60	LASTRADA	\$ 9.504,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%

Caluma	VARIOS SECTORES	Vía Caluma - Piedra Redonda. Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado / Limpieza de cunetas a máquina / Construcción de badén para recuperar el flancho de la vía	MEJORAMIENTO VIAL/ LIMPIEZA DE CUNETAS / CONSTRUCCIÓN DE BADEN	MANTENIMIENTO VIAL	7,30	LASTRADA	\$ 28.508,53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Vía Caluma - Chamquiayacu Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	MEJORAMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO VIAL	1,50	ASFALTADA	\$ 3.903,80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Tendido de material-relleno de caponeras/ Vía San Pablo-Las Malvinas-Plaza Roja	TENDIDO DE MATERIAL	LASTRADO	4,70	LASTRADA	\$ 18.659,08	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Conformación de muro con piedra escollera en el puente El Guabito-El Congreso	CONFORMACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA	DESAZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	1,00	LASTRADA	\$ 10.470,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Conformación de muro con piedra escollera en el malicón de La Floresta/ minado/ cargado y transporte de material/ dragado y relleno del puente en el sector de Chinivi	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DESAZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	2,00	LASTRADA	\$ 26.960,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Vía Río Verde-Santa Lucía-Pitiambe reconformación de la estructura de la vía	RECONFORMACIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	9,00	LASTRADA	\$ 20.655,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Conformación de muro de escolleras/ dragado de río en el puente El Congreso y limpieza de derrumbes	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DESAZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	3,00	LASTRADA	\$ 23.384,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Conformación de muro de escolleras/ dragado de río/ relleno y tendido de material n el sector Galápagos/ relleno de material para puente dueto cajón en la comunidad de Santa Lucía	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DESAZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	2,50	LASTRADA	\$ 25.444,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Conformación de vía San José de Camurón-Carimam	CONFORMACIÓN DE VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	5,70	LASTRADA	\$ 22.446,60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Conformación de vía San Francisco de Orongo-la Y-La Vaquera/ previo cobcación de asfalto	CONFORMACIÓN DE VÍA - PREVIA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	MANTENIMIENTO VIAL	4,70	ASFALTADA	\$ 109.533,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Echeandia	VARIOS SECTORES	Asfaltado de la vía Vía San Francisco de Orongo-la Y-La Vaquera	ASFALTADO	ASFALTADO	5,00	ASFALTADA	\$ 244.940,00	POR CONTRATO	FINALIZADA	100%
		Tendido de material granular en la vía acceso a Monterrey/ previo colocación de asfalto	CONFORMACIÓN DE VÍA - PREVIA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	MANTENIMIENTO VIAL	1,00	LASTRADA	\$ 27.080,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Comunidad de Limón -Vía Cadiflora	CONFORMACIÓN DE VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	7,20	LASTRADA	\$ 28.333,60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
		Vía Río Verde-Santa Lucía-Galápagos-Pitiambe	CONFORMACIÓN DE VÍA	MANTENIMIENTO VIAL	5,50	LASTRADA	\$ 17.721,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%

	Dragado/ minado y cargado de material pétreo del río Suquibí para protección del talud en sector las Palmas - Samanes 7	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,40		\$	5.216,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de material pétreo desde el río Suquibí hasta las riberas para protección del talud en sector las Palmas - Samanes 7	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN DE TALUD	LASTRADO	9,00	LASTRADA	\$	8.100,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Dragado/ minado y cargado de material pétreo del río La Unión para el rebacheo de las vías LA UNIÓN EL TRIUNFO/ VOLUNTAD de DIOS/ LAS NAVES CHICO	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,50		\$	6.520,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de material pétreo desde el río Suquibí hasta las vías PARA BACHOS/ LA UNIÓN EL TRIUNFO/ VOLUNTAD de DIOS/ LAS NAVES CHICO	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHO	LASTRADO	12,00	LASTRADA	\$	10.800,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Dragado/ minado y cargado de material pétreo del río El Guabito para el rebacheo de las vías El Guavito/ La Unión/	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,45		\$	2.160,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de material pétreo desde el río Suquibí hasta las vías para BACHOS/ El Guabito para el rebacheo de las vías El Guavito/ La Unión/	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHO	LASTRADO	10,00	LASTRADA	\$	9.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Dragado/ minado y cargado de material pétreo del río Las Barceñas para el rebacheo de las vías La Esperanza	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,43		\$	4.128,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de material pétreo desde el río Suquibí hasta las vías para bacheos/ Las Barceñas para el rebacheo de las vías La Esperanza/	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHO	LASTRADO	8,60	LASTRADA	\$	7.740,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Dragado para muro de escollera encauce/ cargado y dragado del río suquibí/ aguas arriba y aguas abajo del sector parque las iguanas.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,43		\$	2.752,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de material pétreo desde el río Suquibí a las riberas del río sector las iguanas - puente caído - cantón las Naves	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHO	LASTRADO	6,40	LASTRADA	\$	5.760,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Construcción de muro de escollera en el sector Paraiso río Suquibí	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,10		\$	3.260,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de piedras bola desde el río Suquibí para la construcción de muro de escollera desde el sector de San Luis de Pambil/	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHO	LASTRADO	7,30	LASTRADA	\$	9.198,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Dragado del Río Suquibí - sector Paraiso - Dragado del Río Buenos Aires. encauce/ cargado y dragado del río suquibí/ aguas arriba y aguas abajo del sector parque las iguanas.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVEY MUROS DE ESCOLLERAS	0,65		\$	4.160,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
	Transporte de material de piedra bola para la protección del puente en el sector Paraiso - Puente caído/ San Luis de Pambil/	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHO	LASTRADO	4,20	LASTRADA	\$	3.780,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Las Naves	VARIOS SECTORES									

Dragado del río Suquibí y cargado de material para muro de dragado - bareto MIRADOR.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE	0,36		\$	2.304,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Transporte de material de lastre del río para la construcción del muro sector el Mirador	TRANSPORTE DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN DE MURO	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	6,30		\$	5.670,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Calzado con piedras bolas para proteger las aletas y base del puente bayle.	PROTECCIÓN DE PUENTES	MANTENIMIENTO VIAL	0,12		\$	768,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Dragado del Río Suquibí - Protección del Puente Principal.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE	0,14		\$	896,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Transporte de material de lastre para la vía Manga Central y la Cadena.	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BACHEO	LASTRADO	6,30	LASTRADA	\$	5.670,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Limpieza de cunetas y rebacheo en la Vía Manga Central - La Cadena/	LIMPIEZA DE CUNETAS / REBACHEO	MANTENIMIENTO VIAL	3,50	LASTRADA	\$	8.820,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Dragado y cargado de material en el río Suquibí sector Iguanitas.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE	0,41		\$	5.248,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Transporte de piedra bola para la protección de talud en el sector Iguanitas Río Suquibí.	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN DE TALUD	LASTRADO	4,30	LASTRADA	\$	3.870,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Limpieza de cunetas y rebacheo en la Vía Manga Central - La Cadena/	LIMPIEZA DE CUNETAS / REBACHEO	MANTENIMIENTO VIAL	3,50	LASTRADA	\$	8.820,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Dragado y cargado de material construcción de MURO de protección sector Puente Principal de las Navas y las Iguanitas.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,48		\$	3.072,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Dragado y cargado de material construcción de MURO de protección para el Canal de riego de la Junta Suquibí - Cumandá en el sector de Suquibí Viejo.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	DES AZOLVE Y MUROS DE ESCOLLERAS	0,53		\$	6.784,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%
Dragado y cargado de material recuperación de la plataforma y apertura de una nueva variante en la carretera Voluntad de Dbos.	DRAGADO / MURO DE ESCOLLERA	AMPLIACION DE VIA	0,85		\$	10.880,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100%

Fuente: Secretaría de Vialidad 2024



**ASFALTO DE LA VÍA PUENEBATA - SIMIÁTUG**





**LASTRADO DE LA VÍA SIMIÁTUG - MOISAN**






**DRAGADO RIO CANTÓN LAS NAVES**



**DRAGADO RIO CANTÓN CALUMA**



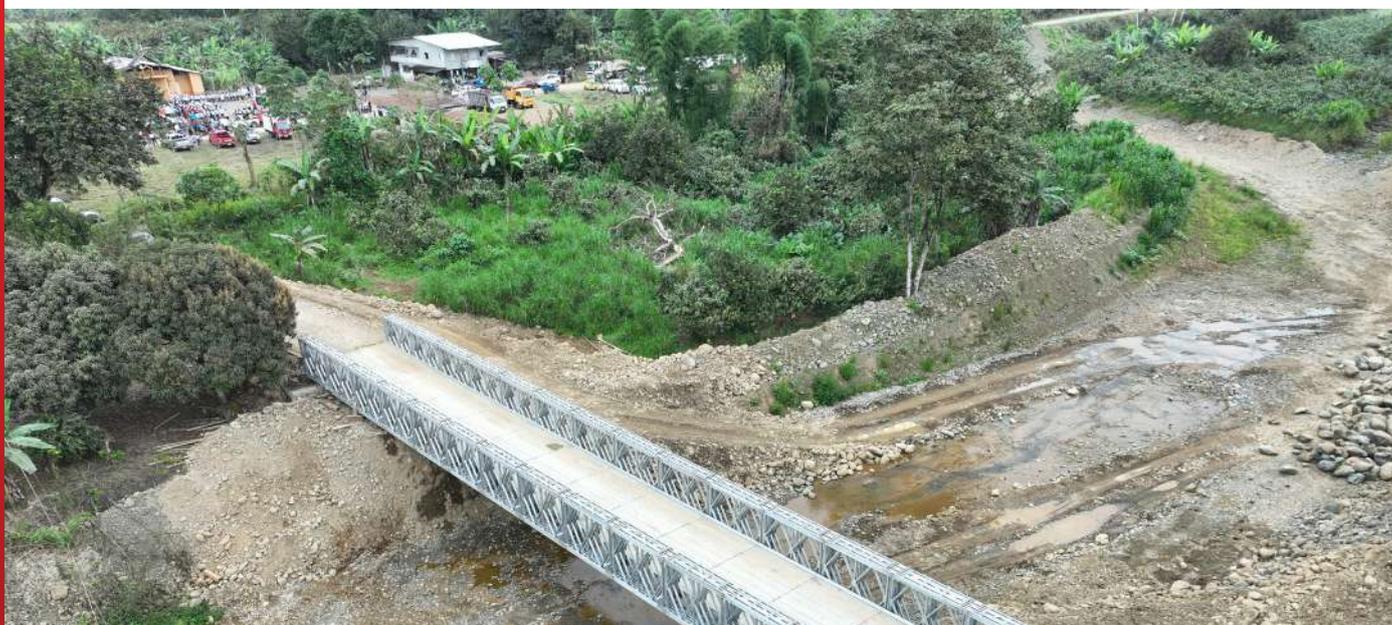



PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

Secretaría <sup>DE</sup>  
**OBRAS**  
**PÚBLICAS**

# OBRAS PÚBLICAS

Los trabajos de infraestructura del Gobierno Provincial han sido articulados con parroquias y comunidades, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Se han ejecutado:

- **24 cubiertas tipo coliseo**
- **5 puentes carrozables** en Tablas del Parnazo, María Aurora, Angas, Chaguarpata y en la vía Telimbela – Caluma
- **620 metros lineales de alcantarillas** metálicas y de PVC
- **4 puentes ducto cajón**, con el reforzamiento de 6 muros de protección de taludes
- Reforzamiento estructural de **13 puentes en riesgo de colapso** por efectos invernales
- Restauración de **2 puentes colgantes**.
- Inicio la Construcción del **estadio Básico en Sabanetillas**

Estas obras representan una inversión total de **USD 2.483.246,64**. De los cuales por Administración Directa corresponde a **\$609.384,02**, y por Contratación son un monto de **\$1.873.862,62**



**CUBIERTA TIPO COLISEO - SAMAMA CENTRAL**

#	CANTÓN	PARROQUIAS	DETALLE DEL PROYECTO	CANTIDAD CUBIERTAS	CANTIDAD PUENTES	MONTO DE INVERSIÓN (USD)	TIPO DE INTERVENCIÓN
1	Guaranda	Ángel Polibio Chávez	ENTREGA DE CEMENTO Y VARRILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO VIAL EN DIFERENTES VÍAS			\$ 52.060,76	POR CONTRATO
		Veintimilla	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA -QUIVILLUNGO	1		\$ 28.117,93	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
			COLOCACION DE ALCANTARILLAS TOLAPUNGO			\$ 4.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		Guanujo	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LA COMUNIDADES DE MANZANAPAMBA, CHAZOJUAN Y SAN JUAN DE LULLUNDONGO	3		\$ 171.808,88	POR CONTRATO
			COTO-GADP-B-2024-006 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN: COMPLEJO TURÍSTICO LAGO LAS COCHAS Y CHAZOJUAN DEL CANTÓN GUARANDA; Y SAN PABLO DE ATENAS - CANTÓN SAN MIGUEL			\$ 175.617,42	POR CONTRATO
			ADECENTAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO LAS COCHAS			\$ 26.208,00	POR CONTRATO
		Facundo Vela	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA COMUNIDAD SANTA TERESA - FACUNDO VELA (ESC. 23 DE ABRIL)	1		\$ 43.854,74	POR CONTRATO
			REFORZAMIENTO DE PUENTE COLGANTE FLORIDA			\$ 6.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		Julio E. Moreno					
		Salinas	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN CRUZ LOMA REFORZAMIENTO DE MUROS EN LO PUENTES EN LA VÍA CHAZO JUAN Y ASHPA CORRAL			\$ 19.309,75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		San Lorenzo	REALIZACIÓN DE PUENTES DUCTO CAJÓN EN SAN LORENZO			\$ 18.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		San Simón					
		Santa Fe	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS VIALES EN SANTA FE - VERDE PAMBA			\$ 3.259,08	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		Simiatug	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA COMUNIDAD SALÉALO (ESC. RUNA SHUNKO)	1		\$ 39.920,47	POR CONTRATO
			REALIZACIÓN DE PUENTE DUCTO CAJÓN EN CUTAHUA Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN TILINGUALA			\$ 11.627,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
San Luis de Pambil	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLES EN MARÍA AURORA			\$ 95.905,24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RESTAURACIÓN LA CANCHA DEPORTIVA DE SAN LUIS DE MERCEDES			\$ 26.208,00	POR CONTRATO		
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS VIALES EN LIBERTAD DE SALINAS Y TABANAL CHICO - CHIGUIPI JILIMBI, BARRIO LOS NEGritos, SAN FERNANDO / REFORZAMIENTO DE MUROS EN EL PUENTE SAN FERNANDO / REALIZACIÓN DE PUENTES DUCTO CAJÓN EN LA CHONGONA Y ROSA ELVIRA			\$ 79.814,26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
2	Chimbo	Chimbo	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA UNID. EDUCATIVA SERGIO BERMEO - EL RODEO - UNID. CORINA PARRAL	3		\$ 144.515,98	POR CONTRATO
			CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ATIOBAJO			\$ 6.430,10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		La Asunción					
		La Magdalena					
		San Sebastián	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LAMBAZA	1		\$ 26.357,91	POR CONTRATO
		Telimbela	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DEL TRONADOR	1		\$ 56.059,77	POR CONTRATO
			CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON EN LA PARROQUIA TELIMBELA			\$ 179.811,59	POR CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLES EN TABLAS DE PANAZO				\$ 55.130,53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		



3	San Miguel	San Miguel	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA SECTOR 24 DE MAYO	1		\$ 53.021,98	POR CONTRATO
			REALIZACIÓN DE PUENTE DUCTO CAJÓN EL RIPIO			\$ 3.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		Balsapamba	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LA COMUNIDAD SANTA LUCIA	1		\$ 110.761,59	POR CONTRATO
			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLES EN VÍA BALSAPAMBA - ANGAS- BILOVAN Y VÍA CHAGUARPATA		2	\$ 88.253,26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		Bilován	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN SECTOR DE GUAPOLOMA Y BILÓVAN	2		\$ 90.221,61	POR CONTRATO
			COLOCACION DE ALCANTARILLAS CEDRO PAMBA			\$ 2.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		Régulo de Mora	ENTREGA DE ADOQUINES PARA DIFERENTES VÍAS			\$ 2.200,00	POR CONTRATO
			COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LAS GUARDIAS			\$ 10.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		San Pablo de Atenas	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN TABLAS -ESCUELA GARCÍA MORENO SAN PABLO - PARROQUIA SAN PABLO	3		\$ 141.495,76	POR CONTRATO
Santiago	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DEL TRONADOR	1		\$ 56.059,77	POR CONTRATO		
San Vicente	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARROQ SAN VICENTE	1		\$ 40.408,46	POR CONTRATO		
4	Chillanes	Chillanes	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE ALAGOTO Y COMUNIDAD DE MAMASARA DE CERRITOS	2		\$ 98.918,17	POR CONTRATO
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RESTAURACIÓN DE PUENTES COLGANTES PEATONAL ESPERANZA BAJA			\$ 26.208,00	POR CONTRATO
			CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS VIALES - SAN JOSÉ DE GUAYABAL – UNDUŠHÍ – SECTOR LA MIRAN			\$ 45.898,71	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
		San José del Tambo	ADQUISICIÓN DE 101 PLANCHAS DE ACERO CORRUGADO ANTIDESLIZANTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DEL TAMBO Y LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL PUENTE BAILEY EN EL SECTOR LA ANGELICA			\$ 31.619,58	POR CONTRATO
5	Caluma	Caluma	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLES EN EL KM 3.00 VÍA CALUMA - TELIMBELA		1	\$ 42.253,50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
			CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN SECTOR DE SAMANGA CENTRAL	1		\$ 56.697,08	POR CONTRATO
			REALIZACIÓN DE PUENTES DUCTO CAJÓN EN CALUMA TELIMBELA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS GUAMASPUNGO -			\$ 31.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6	Echeandía	Echeandía	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL RECINTO PURUHJAY	1		\$ 53.666,78	POR CONTRATO
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VIALES SECTOR LA Y DE PITAMBE - ANTA ANA ALTO-VÍA AL CONGRESO Y SECTOR PLAZA ROJA – SAN PABLO REALIZACIÓN DE PUENTES DUCTO CAJÓN EN SAN LUCIA Y PLAZA ROJA REFORZAMIENTO DE MUROS EN LOS PUENTES GUABITO, SAN GERARDO Y LA LA PLAYTA			\$ 59.384,66	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
			MCO-GADP-B-2024-001 - CONSTRUCCIÓN ESTADIO BÁSICO SABANETILLAS ECHEANDÍA			\$ 164.748,74	POR CONTRATO
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EL RECINTO LA ESPERANZA BAJA			\$ 5.411,58	POR CONTRATO

Fuente: Secretaria de Obras Publicas 2024





**PUNTES CARROZABLE DE HORMIGÓN ARMADO**





**CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS**





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

Secretaría <sup>DE</sup>

**RIEGO**

**Y DRENAJE**

# RIEGO Y DRENAJE

La Prefectura ha destinado **USD 3.542.257,12** a la construcción de **6 sistemas de riego** en:

- 1.- Atandagua
- 2.- Joyocoto
- 3.- Chiquisungo
- 4.- Gerrana
- 5.- Ungubí
- 6.- Quindigua

Beneficiando a **4.520 personas (1.426 familias)** y abarcando **1.063,24 hectáreas** de producción agrícola y ganadera.

También se ha trabajado en el mejoramiento de sistemas de riego en sus líneas de conducción y tanques de reserva en los sectores:

- Callanayacu
- Tigrillo
- Shacundo
- Panshina - Tandahuan
- Papaloma

Además de realizar 2 estudios técnicos para nuevos sistemas en San Lorenzo y Salaleo (Simiatug).



**SISTEMA DE RIEGO QUINDIGUA**

AÑO 2024													
#	CANTÓN	PARROQUIAS	DETALLE DE PROYECTOS	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN N M2	SECTOR BENEFICIARIO / COMUNIDAD	ALMACENAJE M3	POBLACIÓN BENEFICIARIA	ÁREAS DE INTERVENCIÓN HECTÁREAS	MONTO INVERSIÓN (FUADO EN EL POA)	TIPO DE INTERVENCIÓN	STATUS	% DE AVANCE	
1	Guaranda	Guanujo	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PARA ALIMENTAR CAUDAL DE LA JUNTA REGANTES CALLANAYACU TIGRILLO (CUBRIR DETALLE)		CALLANAYACU TIGRILLO	N/A	60	100	\$ 5.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ATANDAHUA, PARROQUIA GUANUJO PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	491	ATANDAHUA	400	75	34,32	\$ 329.737,31	POR CONTRATO	TRABAJANDO	70	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUINDIGUA BAO Y QUINDIGUA GRANDE, PARROQUIA GUANUJO, PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	640	QUINDIGUA	1930	100	147,4	\$ 596.626,60	POR CONTRATO	TRABAJANDO	70	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JOYOCOTO	500	JOYOCOTO	800	249	66,98	\$ 895.495,11	POR CONTRATO	FINALIZADA	100	
		San Lorenzo	ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO SAN LORENZO		SAN LORENZO			310	310	\$ 25.000,00	POR CONTRATO	TRABAJANDO	100
		San Simón	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SHACUNDO	9	SHACUNDO	11,25	15	15	\$ 2.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100	
			MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PANSHINA TANDAHUAN		PANSHINA TANDAHUAN			28	28	\$ 1.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100
		Simiatug	MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUES DE RESERVA DEL SISTEMA DE RIEGO PAPA- LOMA	374	PAPA LOMA	1500	48	48	\$ 12.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100	
			ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SALALEO		SALALEO			48	48	\$ 534.294,55	POR CONTRATO	FINALIZADA	100
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIQUIZUNGO, PARROQUIA SIMIATUG, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	800	CHIQUIZUNGO	1500	145	46,05	\$ 25.000,00	POR CONTRATO	TRABAJANDO	100	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO GERRANA, PARROQUIA SIMIATUG, PROVINCIA DE BOLÍVAR	590		GERRANA	1000	107	30,64	\$ 371.103,55	POR CONTRATO	FINALIZADA	100			
3	San Miguel	San Vicente	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO UNGUBI		UNGUBI		64	151,85	\$ 743.000,00	POR CONTRATO	TRABAJANDO	70	
7	Las Naves		MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN EL TANQUE DE RESERVA DEL SS. RR LA CADENA	225	LA CADENA		35	35	\$ 2.000,00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FINALIZADA	100	

Fuente: Secretaria de Riego y Drenaje 2024



**SISTEMA DE RIEGO JOYOCOTO**



**SISTEMA DE RIEGO JOYOCOTO**



**SISTEMA DE RIEGO SALALEO**



**SISTEMA DE RIEGO SALALEO**



**SISTEMA DE RIEGO SANTA FÉ**



**MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO ATANDAHUA**





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

Secretaría <sup>DE</sup>  
**AMBIENTE**  
**Y RIESGOS NATURALES**

## AMBIENTE Y RIESGOS NATURALES

Desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Riesgos Naturales, se invirtieron **USD 1.893.969,25**, logrando declarar **42.887 hectáreas de páramos** como **Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS-PÁRAMO)** involucra a las parroquias de Veintimilla, Guanujo, Salinas, San Lorenzo, San Simón, Simiatug en el cantón de Guaranda y las Parroquias de Santiago y San Vicente en el Cantón San Miguel. Este proceso incluye acuerdos de conservación, estudios de balance hídrico y de suelos, así como acciones frente al cambio climático.

Este proyecto es financiado por:

- **UNIÓN EUROPEA** con un aporte de \$773.315,43,00
- **PROMOCIÓN HUMANA** con un aporte de \$24.749,39
- **PREFECTURA** con un aporte de \$ 217.768,00 (equipo técnico y movilización)
- **CONDESAN** con un aporte de \$ 50.400
- **BYOS Y ECOPAR** con un aporte de \$ 26.000

Además, se impulsa un proyecto de **mitigación de riesgos ambientales y alimentarios** basado en sistemas agroecológicos resilientes en **16 comunidades** de Chillanes y Echeandía, con procesos de capacitación en prevención y gestión de riesgos.

Este proyecto está financiado por:

- **UNIÓN EUROPEA** con un aporte de \$ 776,736,43
- **Maquita y la Prefectura de Bolívar** (equipo técnico y movilización) aportan un total de \$ 25.000.

En un hito histórico, se ha implementado el programa **“Manos a la Siembra”**, logrando la entrega de **más de 10.000 plantas** a unidades educativas y comunidades, fomentando la reforestación y el cuidado de los ecosistemas.



**PROYECTO MANOS A LA SIEMBRA - CALUMA**



**PÁRAMO BOLIVARENSE VÍA GUARANDA - AMBATO**



**VÍA GUARANDA - ECHEANDÍA**



**PROYECTO NDT**



**PROYECTO MANOS A LA SIEMBRA - LAS NAVES**



**FUNDACIÓN SU CAMBIO POR EL CAMBIO - SAN SIMÓN**



PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

Secretaría <sup>DE</sup>  
**DESARROLLO**  
ECONÓMICO PRODUCTIVO

# DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

Con una inversión de **USD 950.436**, provenientes de recursos propios y cooperación externa, se promovió la diversificación productiva mediante:

- Entrega de **450 plantas nativas y 300 frutales**
- Producción acuícola con **400.000 alevines de trucha y tilapia** para 530 beneficiarios
- Entrega de semillas de pasto y fertilizantes para **112 beneficiarios, cubriendo 115 hectáreas**
- Implementación de **prácticas de ganadería sostenible** mediante inseminación artificial y entrega de medicamentos veterinarios
- Dentro del mejoramiento de las **cadenas productivas generadoras de valor agregado** en la provincia Bolívar se realizó la entrega y capacitación de maquinaria agroindustrial para optimizar los procesos de transformación y comercialización de productos locales para **11 comunidades de la parroquia Salinas**.
- La provincia Bolívar en sus **140 años de provincialización** realizó varios eventos culturales, deportivos y ferias productivas, donde participaron más de 50 stand de emprendedores de la Bolívar y de varias provincias hermanas del centro del país como Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua al cual visitaron cientos de personas al recinto ferial Bolívar Produce 2024, en el sector del Lago las Cochas.



**ENTREGA DE ALEVINES**

AÑO 2024

PARROQUIAS	DETALLE DE ACTIVIDAD	MONTO INVERSIÓN (FIJADO EN EL POA)	TIPO DE INTERVENCIÓN	STATUS	% DE AVANCE
SALINAS	FORTALECIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO DE LAS ORGANIZACIONES GANADERAS DE LA PROVINCIA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE SUBVENCIONES ( INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS)	\$ 8.000,00	ADMINISTRACIÓN PROPIA	TRABAJANDO	60%
	DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EMPRENDEDOR A FIN DE CONOCER EL ESTADO ACTUAL Y SUS PRINCIPALES NECESIDADES	\$ 10.000,00	ALIANZA CON CUSO INTERNACIONAL	TRABAJANDO	50%
SALINAS	IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SALINAS	\$ 20.000,00	ALIANZA GIZ	FINALIZADA	100%
SALINAS	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE EMPRENDEDORES DE LAS PARROQUIAS SALINAS Y SIMIATUG A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS A NIVEL	\$ 10.000,00	ALIANZA CON CARE	FINALIZADA	100%
TODA EL CANTÓN	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN EL CANTÓN GUARANDA; EN ARTICULACIÓN CON CONDESAN SE ENTREGÓ UN MURAL ARTÍSTICO EN LA PLAZA "15 DE MAYO"	\$ 2.800,00	ALIANZA CON CONDESAN	FINALIZADA	100%
TODA LA PROVINCIA	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA PROVINCIAL SOSTENIBLE	\$ 30.000,00	ALIANZA CON CONDESAN	TRABAJANDO	80%
SAN SIMÓN	FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA EL SISTEMA DE RIEGO "PANLLINA SAN SIMÓN" A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE 500 PLANTAS NATIVAS Y 150 FRUTALES	\$ 1.500,00	ALIANZA CON FAO- SECRETARIA DE AMBIENTE	FINALIZADA	100%
TODA LA PROVINCIA	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PISCICOLA EN LA PROVINCIA A TRAVÉS DE LA ENTREGA SUBVENCIONADA DE 400.000 ALEVINES DE TRUCHA Y TILAPIA	\$ 45.000,00	ALIANZA CON EL MPCEIP	FINALIZADA	100%
TODA LA PROVINCIA	EXPOFERIA "BOLÍVAR PRODUCE" POR LA CONMEMORACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DEL 15 DE MAYO	\$ 60.000,00	ADMINISTRACIÓN PROPIA	FINALIZADA	100%
TODA LA PROVINCIA	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UNA MAQUINA VOLTEADORA DE COMPOST ACOPLABLE A TRACTOR A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR	\$ 15.000,00	ADMINISTRACIÓN PROPIA	TRABAJANDO	70%
ECHÉANDÍA	CIERRE DEL CENTRO DE ACOPIO DE CACAO DE LA ORGANIZACIÓN UNORCIE	\$ 10.459,61	ADMINISTRACIÓN PROPIA	FINALIZADA	100%
SALINAS	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE VALOR AGREGADO EN LA PROVINCIA	\$ 33.828,37	ADMINISTRACIÓN PROPIA	TRABAJANDO	70%
SAN SIMÓN	REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SAN SIMÓN A TRAVÉS DE: 1. ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	\$ 10.700,00	ADMINISTRACIÓN PROPIA	TRABAJANDO	50%
SALINAS Y SIMIATUG	ENTREGA DE SEMILLA DE PASTO Y FERTILIZANTES A 115 HA	\$ 100.000,00	ALIANZA CON CONDESAN	FINALIZADA	100%

Fuente: Secretaría de Departamento Económico Productivo 2024

En lo cultural, se llevaron a cabo eventos, ferias y actividades a través de los proyectos **“Por los Caminos de Bolívar Arte y Cultura,- Arte, Cultura y Patrimonio”** que consistía en convertirles las casas patrimoniales, en centros culturales por un día, con presentaciones artísticas, exposiciones y teatro. Se realizaron estos eventos en **8 casas Patrimoniales de la ciudad Guaranda**.

Además con la caravana cultural se visitó a **15 parroquias de la Provincia**, con eventos artísticos que contó con la cooperación de varias instituciones como la **Universidad Estatal de Bolívar, Banco del Pichincha, Ballet Folclórico Paul Arregui Saltos y los GAD´S**.

Cada evento cultural tenía una acogida de más de **500 asistentes** con una participación de **8.500 personas** durante el año 2024.



AÑO 2024						
CANTÓN	PARROQUIAS	DETALLE DEL PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES	ASISTENCIA (# PERSONAS)	MONTO INVERSIÓN	INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
Guaranda	Ángel Polibio Chávez	ARTE Y PATRIMONIO	APERTURA DE CASAS PATRIMONIALES. SE APERTURARON LA CASA DE LAFAMILIA JARRIN LOMBEIDA, DEL POZO	700	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, FAMILIAS
	Velintimilla	ARTE Y PATRIMONIO	APERTURA DE CASAS PATRIMONIALES. SE APERTURARON 3 CASAS PATRIMONIALES, FAMILIA GONZALES, FAMILIA FALCONI, FAMILIA VARGAS	400	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB
	Facundo Vela	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS	600	\$2.000,00	PREFECTURA, BALLET CULTURAL Y JUNTA PARROQUIAL
	Julio E. Moreno	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	300	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	Salinas	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	600	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	San Lorenzo	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	500	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	Santa Fe	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	300	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	San Luis de Pambil	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	600	\$2.000,00	PREFECTURA, BALLET CULTURAL Y JUNTA PARROQUIAL
Chimbo	La Asunción	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA, CONCIERTO NAVIDEÑO EN LA IGLESIA DE LA PARROQUIA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS	900	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	La Magdalena	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA, FIESTA DE LAS BRUJAS EN EL PUEBLO DE LAS BRUJAS	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB. CONCURSOS Y FIESTA POR EL DÍAS DE LAS BRUJAS.	1300	\$2.000,00	PREFECTURA, BALLET CULTURAL Y JUNTA PARROQUIAL
San Miguel	Balsapamba	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	500	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	Blívain	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	400	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	San Pablo de Atenas	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB	500	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL
	Santiago	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS	600	\$2.000,00	PREFECTURA, BALLET CULTURAL Y JUNTA PARROQUIAL
	San Vicente	POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA	CARAVANA CULTURAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR Y EL BALLET CULTURAL PAUL ARREGUI SALTOS, CORO Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE LA UEB. CONCURSOS Y FIESTA POR EL DÍAS DE LAS BRUJAS.	300	\$2.000,00	PREFECTURA + UEB, JUNTA PARROQUIAL

Fuente: Jefatura de Cultura 2024





**FERIA GANADERA CALUMA**



**EXPO FERIA SAN MIGUEL**



**PRÁCTICAS GANADERAS**



**PROYECTO PISCÍCOLA**



**PROYECTO APÍCOLA**



**BANDA CULTURAL DE LA PREFECTURA DE BOLÍVAR**



**PROYECTO POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y CULTURA**





**EXPO FERIA BOLIVAR EMPRENDE 2024**





**POR LOS CAMINOS DE BOLÍVAR ARTE Y PATRIMONIO**





**ENDURO CROSS 2024**





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

# FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

# FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

A través de la Secretaría Administrativa, se adquirieron equipos y maquinaria por un valor de **USD \$1.794.940,69** incluyendo:

- 10 camionetas
- 2 busetas
- 1 camión
- 10 volquetas
- 1 retroexcavadora
- 1 cama baja
- 2 excavadoras
- 2 rodillos lisos
- 1 tanque de agua (3.000 galones)
- 2 motoniveladoras

Compra de repuestos, lubricantes, llantas y equipamiento tecnológico.

En el área de Talento Humano, se gestionó la jubilación de **5 funcionarios** en 2024 con una inversión total de **\$257.186,78** y está prevista la jubilación de 19 más en 2025, garantizando el acceso a este derecho conforme lo establece la ley.



**ENTREGA DE 10 CAMIONETAS**






**ENTREGA DE MAQUINARIA**



**GERENTA DEL BDE**

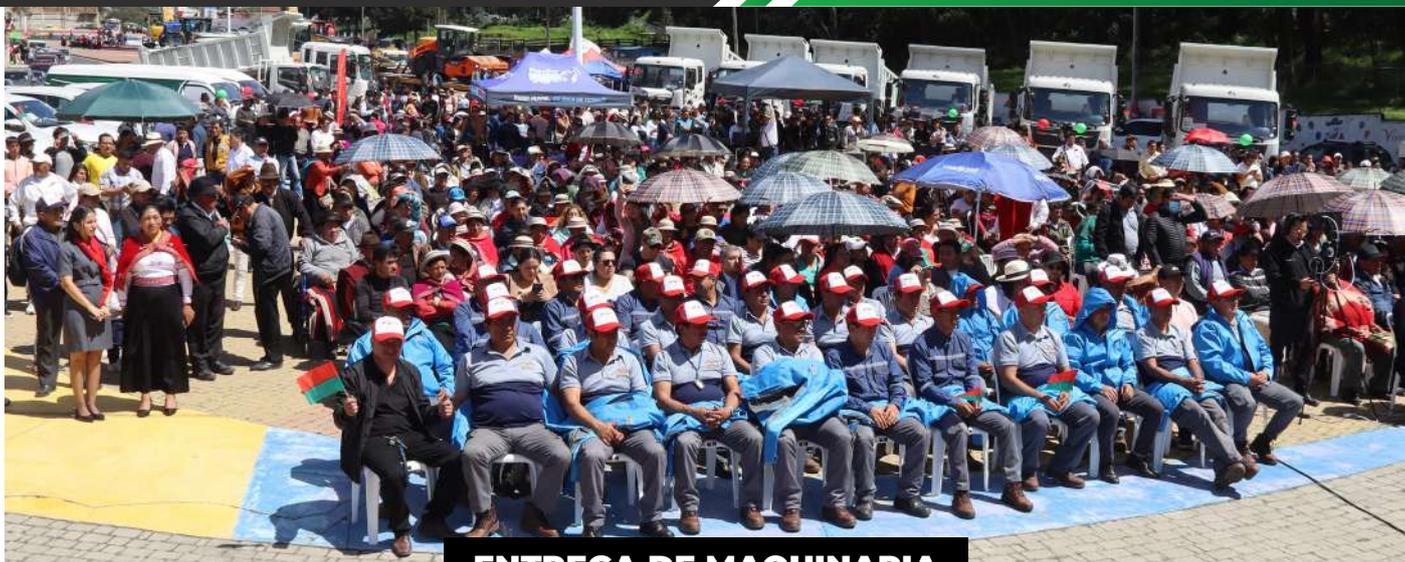

**ENTREGA DE MAQUINARIA**





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**


# IPAS-Bolívar

# INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL - BOLÍVAR

El IPASB ha atendido con vocación solidaria a **7.639 personas en situación de vulnerabilidad**, a través de cinco programas emblemáticos:

- Sin Barreras
- Hombro a Hombro por la Salud de Bolívar
- Años Dorados
- Wawa Bolívar
- Bolívar Libre de Violencia

Estos programas han brindado atención **médica, psicológica, ayudas técnicas y kits alimenticios**, con una inversión de **USD 997.521,15**.

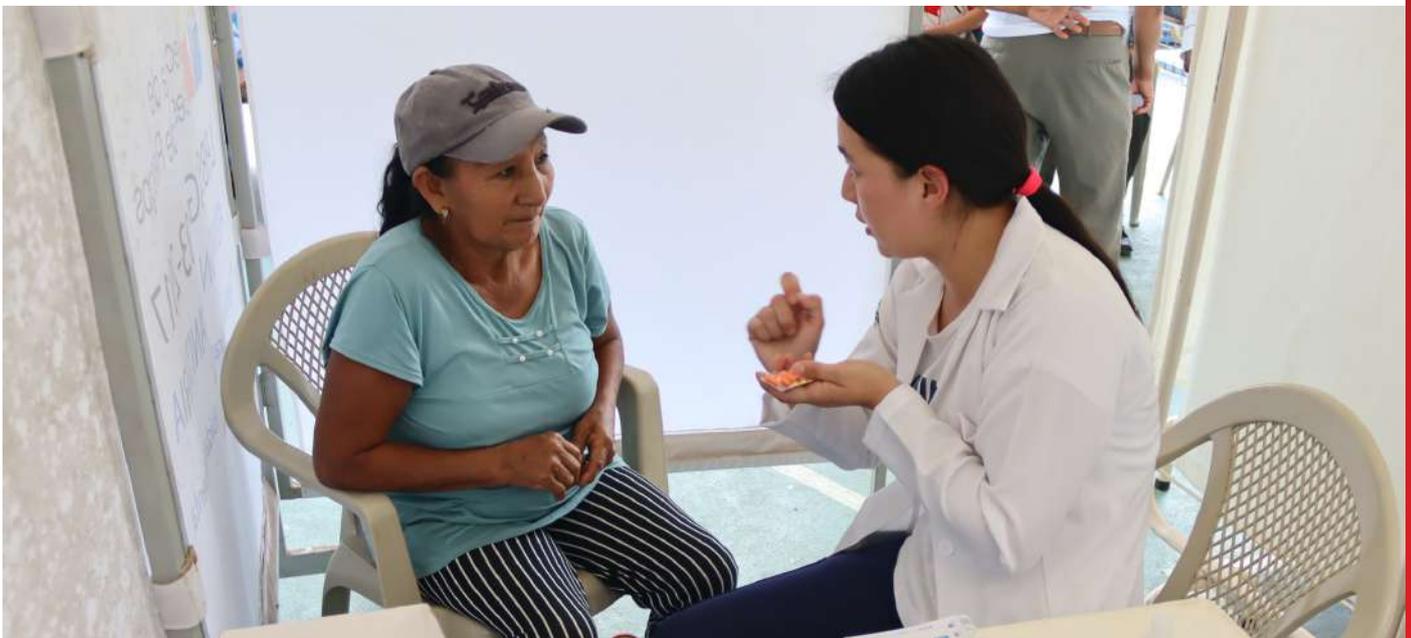



**JORNADAS MÉDICAS**







**ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS**





**PROGRAMA AÑOS DORADOS**





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**


Empresa Pública <sup>DE</sup>  
**TURÍSMO**

# EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO

La Empresa Pública de Turismo de la Prefectura ha invertido **USD 114.296,89** en mantenimiento y mejoras en los complejos turísticos:

- Parque Acuático Josefina Barba (Balsapamba)
- Lago Las Cochas (Guanujo), donde se colocaron **4.400 m<sup>2</sup>** de doble riego asfáltico, optimizando los servicios y atrayendo a más visitantes.



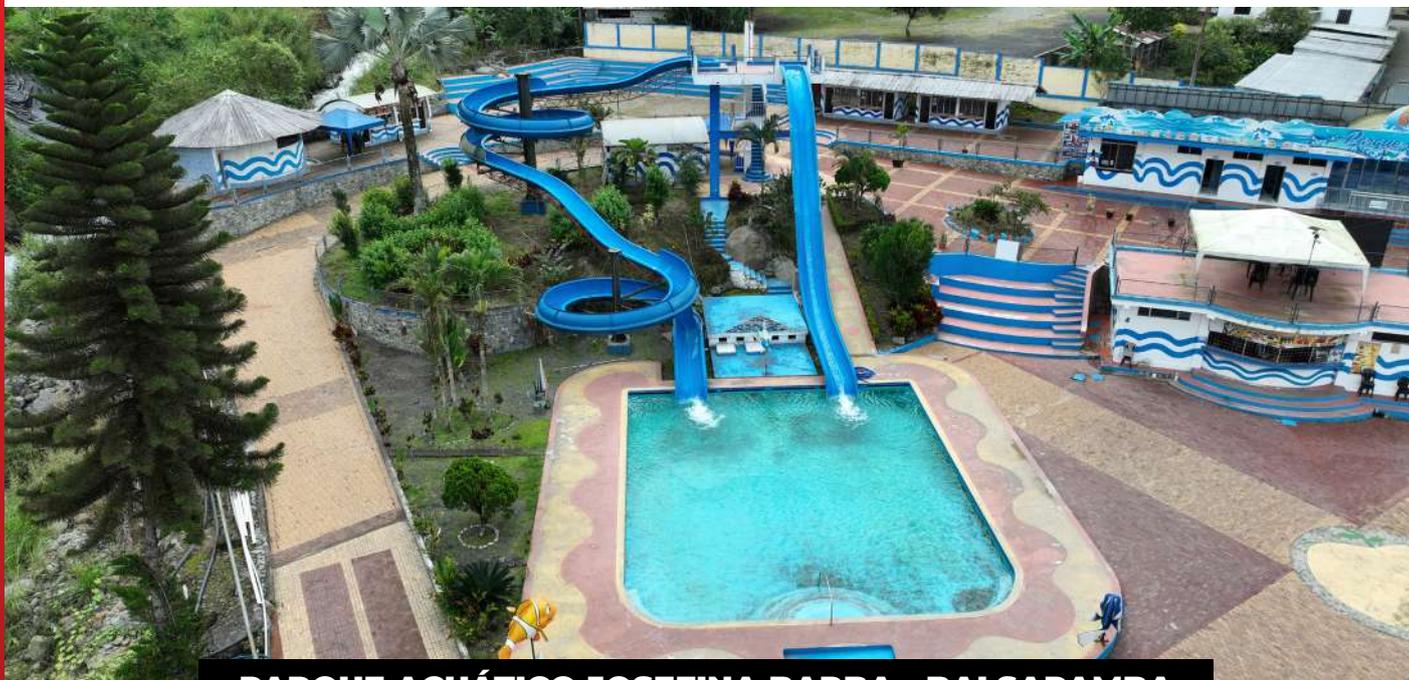

**PARQUE ACUÁTICO JOSEFINA BARBA - BALSAPAMBA**





**COMPLEJO TURÍSTICO LAGO LAS COCHAS**





PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**

Cumplimiento al Plan DE

**TRABAJO**

# PLAN DE TRABAJO

Nuestro Plan de Trabajo, correspondiente a estos dos años de gestión, presenta un avance del **52,99 %**. Este progreso refleja logros concretos en los objetivos establecidos dentro de los ejes **Ambiental, Económico, Sociocultural y Político-Institucional**.

Estos resultados evidencian que avanzamos con paso firme hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Provincia en nuestra propuesta de campaña, a pesar de las adversidades existentes.

EJE AMBIENTAL	EJE ECONOMICO	EJE SOCIO-CULTURAL	EJE POLITICO - INSTITUCIONAL	PORCENTAJE 2023-2024
66,00	24,17	64,29	57,50	52,99

PLAN DE TRABAJO ING. ANIBAL CORONEL									
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS - EJE AMBIENTAL									
EJES	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	PORCENTAJE 2023-2024
EJE AMBIENTAL	Gestionar y promover mecanismos para el cuidado ambiental de la Provincia, considerando fundamentalmente la protección del agua, vegetación nativa y el manejo de desechos en concordancia con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Parroquiales	Establecer áreas de paramo no intervenidas	Diagnostico / Estudio	1	1	0	0	0	66%
		Establecimiento de acuerdos y/o compra de terrenos (páramo) que se gestionara la declaratoria de reserva hídrica	Hectárea	6000	0	1000	3000	2000	
		Apoyar con proyectos productivos a las familias ubicadas en la franjas indicadas para hacer mas eficiente su producción.	Proyectos	10	0	4	4	2	
		Convenio con los Gobiernos Autónomos a Nivel Cantonal para la participación en el proyecto relacionado con la organización y recolección en los cantones de la Provincia.	Convenio	1	0	1	0	0	
		Proyecto de montaje y operación de una mediana industria de producción de abono organico.	Quintales producidos	150000	0	20000	50000	80000	

PLAN DE TRABAJO ING. ANIBAL CORONEL									
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS - EJE POLITICO- INSTITUCIONAL									
EJES	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	PORCENTAJE 2023-2024
EJE INSTITUCIONAL	Generar un proceso que establezca bases de desarrollo provincial para modificar indicadores sociales, económicos y ambientales	Elaborar un diagnostico institucional técnico y administrativo	Número Diagnóstico	1	1	0	0	0	57,50%
		Diseño de la estructura técnica institucional para la ejecución de los 4 ejes propuestos	Estudio	1	1	0	0	0	
		Manual de Operaciones para área técnica	Manual de Operaciones	1	1	0	0	0	
		Proyectos Financiados Organismo Internacionales	Proyectos	10	2	6	2	0	

PLAN DE TRABAJO ING. ANIBAL CORONEL									
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS - EJES ECONOMICO									
EJES	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	PORCENTAJE (%) 2023-2024
EJE ECONOMICO	Fomentar procesos de producción con rubros agropecuarios, no agropecuarios y turísticos de mayor importancia económica para la provincia fortaleciendo la organización y la competitividad como base fundamental para la sostenibilidad	Estructurar las organizaciones en asociaciones o precooperativas por cada	Organizaciones por rubros	5	1	2	2	0	24,17%
		Capacitación en temas de producción de calidad	Programa de capacitación	5	1	2	2	0	
		Aplicación de subsidios a través de proyectos para mejorar la calidad de la producción agropecuaria, acopio y venta	Programas ejecutados	5	1	2	2	0	
		Integración de grupos por áreas de producción y servicio	Organizaciones por rubros no agropecuarios	5	1	2	2	0	
		Capacitación para mejorar la calidad de producción.	Programas de capacitación	5	1	2	2	0	
		Aplicación de subsidios a través de proyectos para mejorar la empresa familiar o	Proyectos Ejecutados	5	1	2	2	0	
		Actualizar el diagnostico y calificar los emprendimientos con mayores perspectivas de sostenibilidad	Número de Diagnosticos	1	1	0	0	0	
		Formalizar a los emprendedores a través de un gremio jurídico	Número de gremios formados	5	1	2	2	0	
		Elaborar los proyectos de manera participativa	Número de Proyectos	30	5	10	10	5	
		Canalizar servicios viales y accesos a sitios de interes turísticos	Kilómetros	100	0	20	30	50	
		Construcción de rutas y estructuras llamativas en sitios estratégicos	Proyectos Ejecutados	22	7	8	7	0	
Capacitar a operadores comunitarios de servicios turísticos	Programa de capacitación	1	0	1	0	0			
EJE RIEGO	Fomentar y ampliar la cobertura de riego en la provincia tomando como base la organización por rubros agropecuarios	Capacitación técnica para el manejo y cuidado de los sistemas	Juntas de Regantes	100	10	30	50	10	
		Construir microrepresas para colectar agua en sitios estratégicos	Micro represas	5	0	0	5	0	
		Construir sistemas de riego	Hectáreas con riego	1700	200	500	800	200	
		Mejorar sistemas existentes.	Hectáreas con riego	500	200	300	0	0	
EJE VIALIDAD	Impulsar el Plan Vial por cantón tomando como base la producción agropecuaria, la conservación de recursos naturales, turismo y comercio.	Contratación de empresas para la repotencia	Contratos de Servicio	4	1	1	1	1	
		Capacitación al personal de operación y mecánicos para reducir daños y pérdidas	Contratos de Servicio	2	1	0	1	0	
		Proceso de selección y contratación para adquisición de maquinaria para trabajos de vialidad	Paquetes de necesidades de maquinaria	2	0	1	1	0	
		Preparar personal técnico y operativo	Proyecto de capacitación	1	1	0	0	0	
		Proceso de selección y contratación	Contrato de	1	0	1	0	0	
		Asfalto varias vías de la Provincia.	Kilómetros de asfalto	200	50	100	50	0	
		Doble Tratamiento Superficial Bituminoso varias vías de la Provincia.	Kilómetros D.T.S.B.	250	50	100	50	50	
		Lastrado varias vías de la Provincia.	Kilómetros de lastrado	3000	500	800	1000	700	
Apertura varias vías de la Provincia.	Kilómetros de apertura	1000	200	300	300	200			
EJE OBRAS PUBLICAS	Implementar infraestructura deportiva con proyectos para procesos formativos y la recreación familiar comunitaria	Adquisición y legalización terreno.	Escritura Pública	10	10	0	0	0	
		Construcción de estadios básicos	Estadio Básico	10	1	2	4	3	
		Construcción de canchas cubiertas	Cancha Cubierta	60	10	20	15	15	
		Procesos formativos competencias	Proyectos	3	0	1	1	1	



**CUBIERTA EL TRONADOR**



Nuestro Plan de Trabajo, correspondiente a estos dos años de gestión, presenta un avance del **52,99 %**. Este progreso refleja logros concretos en los objetivos establecidos dentro de los ejes **Ambiental, Económico, Sociocultural y Político-Institucional**.

Estos resultados evidencian que avanzamos con paso firme hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Provincia en nuestra propuesta de campaña, a pesar de las adversidades existentes.



**PARROQUIA SAN JOSÉ DEL TAMBO**



PREFECTURA DE  
**BOLÍVAR**



*HOMBRO A HOMBRO*
